

ESTADO DE PAGO N° 1

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E. DE PAGO N°	1
VALOR E. DE PAGO	\$ 24.682.386
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	19-08-2022
AVANCE FISICO %	10,78%
AVANCE FINANCIERO %	10,78%

NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE
UBICACIÓN:	Litueche, VI Región del Gral. Libertador Bernardo O'Higgins

CONTRATISTA:	WETLAND S.A.	RUT:	77.682.460-7
--------------	--------------	------	--------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° : 811	DE: 21 DE JULIO DE 2022
--------------------------------------	-------------------------

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21-07-2022	PLAZO 148 DIAS	FECHA DE TERMINO	16-12-2022
	MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO	:

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 229.055.314
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :	\$ -
MONTO TOTAL :	\$ 229.055.314

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	10,78%		\$ 24.682.386
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	0,00%		\$ -
VALOR DEL PTE. E.P.			\$ 24.682.386
DESCUENTOS			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 24.682.386
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 24.682.386
LIQUIDO A PAGAR		0	\$ 24.682.386


CONTRATISTA
Marcello Rondanelli Padilla


ITO
Genaro Soto Barreda


DOM
Genaro Soto Barreda



WETLAND SOCIEDAD ANONIMA

Giro: CONS.OBRAS SANIT.Y ALCANT.PLANTAS
TRAT.RES.SOL.Y LIQ, ASESORIAS

Miraflores 222 PISO 28- SANTIAGO

eMail : GRUPO_CT5@GGLOBAL.CL Telefono : 2
9282500

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.682.460- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº533

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

R.U.T.: 69.091.100- 0

GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC

DIRECCION: CARDENAL CARO 796


COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago 1 Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche ID 1743-68-LQ22. ID 6203210701-C.	1	20.741.501			20.741.501

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 20.741.501

I.V.A. 19% \$ 3.940.885

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 24.682.386



ESTADO DE PAGO Nº	2
VALOR E. DE PAGO	\$ 39.767.447

ANEXO N° 1: DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS AL

19/08/2022

NOMBRE DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE

CONTRATISTA:

WETLAND S.A

R.U.T:

77.682.460-7

Total c/iva

\$ 24.682.385

ITEM	ITEMS O PARTIDAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS	OBRAS EJECUTADAS	OBRAS EJECUTADAS AL PRESENTE ESTADO DE PAGO		\$	\$	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS HASTA E.P. ANTERIOR	MONTO PRESENTE ESTADO DE PAGO
					\$/UNIDAD	\$				
					PRECIOS UNITARIOS	MONTO OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA				
1	INSTALACIONES PROVISORIAS									
1.1	Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS HH)	uni	1	100%	\$ 1.731.487,00	\$ 1.731.487	\$ -	\$ -	\$ 1.731.487	
1.2	INSTALACION DE FAENA									
1.2.1	Oficina 9m2	uni	3	100%	\$ 750.000,00	\$ 2.250.000	\$ -	\$ -	\$ 2.250.000	
1.2.2	Bodega 12m2	uni	3	100%	\$ 850.000,00	\$ 2.550.000	\$ -	\$ -	\$ 2.550.000	
1.3	Cierres Provisiones	ml	200	0%	\$ 14.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1.4	GASTOS ADICIONALES									
1.4.1	Letrero de Obra	uni	3	100%	\$ 550.000,00	\$ 1.650.000	\$ -	\$ -	\$ 1.650.000	
2	TRABAJOS PREVIOS									
2.1	OBRAS PREVIAS									
2.1.1	Demolición, Extracción, Retiro de Excedentes y Transporte a Botadero	m3	176,0	20%	\$ 80.236,00	\$ 3.141.107	\$ -	\$ -	\$ 3.141.107	
2.1.2	Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno	m2	90,0	25%	\$ 25.090,00	\$ 564.525	\$ -	\$ -	\$ 564.525	
2.1.3	Trazados y Niveles	m2	48,0	50%	\$ 9.565,00	\$ 229.320	\$ -	\$ -	\$ 229.320	
2.1.4	Excavaciones	m3	50,0	25%	\$ 74.068,00	\$ 933.350	\$ -	\$ -	\$ 933.350	
3	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION									
3.1	PTAS Paso Del Soldado									
3.1.1	Tratamiento Primario									
3.1.1.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	uni	2,0	0%	\$ 503.526,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.1.1.2	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	0%	\$ 29.896,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.2	Reactores SBR									
3.2.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	2,0	0%	\$ 2.587.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.2.2	Difusores de burbuja fina SSI 9" AFZ70 o similar	uni	8,0	0%	\$ 29.549,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.2.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	1,0	0%	\$ 503.526,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.2.4	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	3,0	0%	\$ 29.896,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.2.5	Conjunto válvula electro actuada y actuador eléctrico 3 vías 1½" GENEBR	uni	1,0	0%	\$ 1.456.692,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.3	Desinfección									
3.3.1	Bomba dosificadora Etatron PKX/MA o similar	uni	2,0	0%	\$ 199.395,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.3.2	Estanque de reactivo bidón polietileno 60 Lts o similar	uni	2,0	0%	\$ 325.909,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.3.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	0%	\$ 419.984,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4	Otros									
3.4.1	Tablero de fuerza y control									
3.4.1.1	PLC	uni	1,0	0%	\$ 7.280.946,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.1.2	Gabinete	uni	1,0	0%	\$ 528.094,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.1.3	HMI	uni	1,0	0%	\$ 1.984.283,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.1.4	Protectores térmicos	uni	6,0	0%	\$ 251.869,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.1.5	Relés	uni	8,0	0%	\$ 198.664,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación									
3.4.2.1	Inoculación	uni	1,0	0%	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.2.2	Puesta en Marcha									
3.4.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1,0	0%	\$ 1.710.973,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1,0	0%	\$ 1.497.101,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1,0	0%	\$ 1.069.358,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.2.3	Capacitación	uni	1,0	0%	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.4.3	Transporte estanques y equipos	uni	1,0	0%	\$ 1.086.364,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.5	PTAS Escuela Quelentaro									
3.5.1	Tratamiento Primario									
3.5.1.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	uni	2,0	100%	\$ 503.526,96	\$ 1.007.052	\$ -	\$ -	\$ 1.007.052	
3.5.1.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	uni	2,0	0%	\$ 29.896,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.5.1.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GENEBRE 2 vías 1"	uni	2,0	0%	\$ 931.132,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.6	Reactores SBR									
3.6.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	1,0	0%	\$ 2.587.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.6.2	Difusores Burbuja fina SSI 9" o similar	uni	8,0	0%	\$ 29.549,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.6.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	0%	\$ 29.896,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.6.4	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GENEBRE 3 vías 1"	uni	1,0	0%	\$ 1.456.693,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.6.5	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	2,0	50%	\$ 503.526,96	\$ 503.526	\$ -	\$ -	\$ 503.526	
3.7	Radier Desinfección									
3.7.1	Hormigón H-25	m3	3,1	0%	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.7.2	Fierro estimado	kg	475,4	0%	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.7.3	Excavaciones	m3	3,1	0%	\$ 74.687,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.8	Desinfección									
3.8.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	0%	\$ 419.985,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.8.2	Bomba dosificadora Etatron PKX/MA o similar	uni	2,0	0%	\$ 199.394,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.8.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	0%	\$ 29.896,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.8.4	Bidón polietileno 60 Lts o similar	uni	2,0	0%	\$ 193.006,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.8.5	Estanque de fibra de vidrio 6m3	uni	1,0	0%	\$ 1.794.963,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.9	Radier Espesador									
3.9.1	Hormigón H-25	m3	0,8	0%	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.9.2	Fierro estimado	kg	122,9	0%	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.9.3	Excavaciones	m3	0,8	0%	\$ 74.687,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.10	Espeador									
3.10.1	Espeador de fibra de vidrio 1m3	uni	1,0	0%	\$ 521.118,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.10.2	Bomba de descarga clarificado Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	0%	\$ 419.985,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.10.3	Bomba de descarga lodo Zenit DG Blue 75 o similar	uni	1,0	0%	\$ 503.526,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.11	Digestor									
3.11.1	Soplador DVP CB 25 o similar	uni	1,0	100%	\$ 1.997.775,34	\$ 1.997.775	\$ -	\$ -	\$ 1.997.775	
3.11.2	Difusores Burbuja Gruesa SSI o similar	uni	2,0	100%	\$ 17.529,00	\$ 35.058	\$ -	\$ -	\$ 35.058	
3.12	Otros									
3.12.1	Tablero de fuerza y control									
3.12.1.1	PLC	uni	1,0	0%	\$ 2.330.946,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.1.2	Gabinete	uni	1,0	0%	\$ 528.094,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.1.3	HMI	uni	1,0	0%	\$ 1.984.283,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.1.4	Protectores térmicos	uni	9,0	0%	\$ 251.869,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.1.5	Relés	uni	11,0	0%	\$ 198.664,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación									
3.12.2.1	Inoculación	uni	1,0	0%	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.2.2	Puesta en Marcha									
3.12.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1,0	0%	\$ 3.884.748,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1,0	0%	\$ 3.407.904,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1,0	0%	\$ 2.434.217,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.2.3	Capacitación	uni	1,0	0%	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.12.3	Transporte estanques y equipos	uni	1,0	0%	\$ 965.034,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

C	PTAS Posta Quemataro					\$	-	\$	-	\$	-
3.13	Fosa Pulmón					\$	-	\$	-	\$	-
3.13.1	Hormigón H-25	m3	4,1	0%	\$	290.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.13.2	Fierro estimado	kg	865,8	0%	\$	5.250,00	\$	-	\$	-	\$
3.13.3	Excavaciones	m3	5,8	0%	\$	74.687,62	\$	-	\$	-	\$
3.14	Cámara de Bombeo					\$	-	\$	-	\$	-
3.14.1	Bomba de carga ZENIT DG Blue 50 o similar	uni	2,0	0%	\$	434.402,43	\$	-	\$	-	\$
3.14.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	uni	2,0	0%	\$	28.746,48	\$	-	\$	-	\$
3.14.3	Hormigón H-25	m3	2,7	0%	\$	979.295,74	\$	-	\$	-	\$
3.14.4	Fierro estimado	kg	495,5	0%	\$	10.315,25	\$	-	\$	-	\$
3.14.5	Excavaciones	m3	2,9	0%	\$	74.687,62	\$	-	\$	-	\$
3.15	Radier SBR					\$	-	\$	-	\$	-
3.15.1	Hormigón H-25	m3	0,7	0%	\$	290.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.15.2	Fierro estimado	kg	140,0	0%	\$	5.250,00	\$	-	\$	-	\$
3.15.3	Excavaciones	m3	0,7	0%	\$	74.687,62	\$	-	\$	-	\$
3.16	Reactor SBR					\$	-	\$	-	\$	-
3.16.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 50 o similar	uni	2,0	0%	\$	434.402,43	\$	-	\$	-	\$
3.16.2	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	3,0	0%	\$	28.746,48	\$	-	\$	-	\$
3.16.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GENEBRE 3 vías 1"	uni	1,0	0%	\$	1.456.093,00	\$	-	\$	-	\$
3.16.4	Soplador DVP CBB o similar	uni	1,0	0%	\$	751.478,00	\$	-	\$	-	\$
3.16.5	Diffusor SSI Burbuja fina 9" o similar	uni	2,0	0%	\$	29.549,00	\$	-	\$	-	\$
3.16.6	Estanque de fibra de vidrio 3,7 m3	uni	1,0	0%	\$	1.063.092,00	\$	-	\$	-	\$
3.17	Radier Desinfección					\$	-	\$	-	\$	-
3.17.1	Hormigón H-25	m3	0,6	0%	\$	290.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.17.2	Fierro estimado	kg	117,6	0%	\$	5.250,00	\$	-	\$	-	\$
3.17.3	Excavaciones	m3	0,6	0%	\$	74.687,62	\$	-	\$	-	\$
3.18	Desinfección					\$	-	\$	-	\$	-
3.18.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	0%	\$	419.985,00	\$	-	\$	-	\$
3.18.2	Bomba dosificadora Elastron PKC/MA o similar	uni	2,0	0%	\$	199.395,00	\$	-	\$	-	\$
3.18.3	Tanbor polietileno 220 Lts o similar	uni	2,0	0%	\$	206.916,42	\$	-	\$	-	\$
3.18.4	Estanque de fibra de vidrio 2m3	uni	1,0	0%	\$	940.123,91	\$	-	\$	-	\$
3.19	Caseta de Máquinas					\$	-	\$	-	\$	-
3.19.1	Hormigón H-25	m3	4,7	0%	\$	290.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.19.2	Fierro estimado	kg	924,9	0%	\$	5.250,00	\$	-	\$	-	\$
3.19.3	Excavaciones	m3	16,3	0%	\$	74.687,62	\$	-	\$	-	\$
3.20	Otros					\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1	Tablero de fuerza y control					\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1.1	PLC	uni	1,0	0%	\$	3.280.946,58	\$	-	\$	-	\$
3.20.1.2	Gabinete	uni	1,0	0%	\$	528.094,66	\$	-	\$	-	\$
3.20.1.3	HMI	uni	1,0	0%	\$	1.584.283,97	\$	-	\$	-	\$
3.20.1.4	Protectores térmicos	uni	6,0	0%	\$	251.869,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.1.5	Relés	uni	8,0	0%	\$	198.664,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación					\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.1	Inoculación	uni	1,0	0%	\$	700.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.2.2	Puesta en Marcha					\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1,0	0%	\$	3.107.712,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1,0	0%	\$	2.719.248,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.2.2.3	Pruebas y Recopón	uni	1,0	0%	\$	1.942.320,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.3	Capacitación	uni	1,0	0%	\$	300.000,00	\$	-	\$	-	\$
3.20.4	Transporte estanques y equipos	uni	1,0	0%	\$	1.044.582,12	\$	-	\$	-	\$
4	ASEO Y ENTREGA					\$	-	\$	-	\$	-
4.1	Retiro de Fuentes y Limpieza de Terreno	uni	3	0%	\$	850.000,00	\$	-	\$	-	\$

SUB TOTAL NETO	16.593.201	\$	-	16.593.201
GASTOS GENERALES	2.488.980	\$	-	2.488.980
UTILIDADES	1.659.320	\$	-	1.659.320
TOTAL NETO	20.741.501	\$	-	20.741.501
19% I.V.A.	3.940.885	\$	-	3.940.885
SUBTOTAL CON I.V.A INCLUIDO	24.682.386	\$	-	24.682.386

MARCELO RONDANELLI
GERENTE DE PROYECTOS Y OPERACIONES
WETLAND S.A
R.U.T. 77.682.460-7





DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:

Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
2000	2022	12496009

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259-7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
miraflores 222		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
Mejoramiento 3 P.T.A.S Comuna de litueche		
DOMICILIO DE LA OBRA		
Cardenal caro 796		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCLADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	13

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
7	2022	13	21406867	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	Ilustre Municipalidad de Litueche	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631592-0	Rene Acuña Echeverría	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Cardenal Caro 796		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	22-209800

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 7/2022 y 7/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 18-08-2022 12:00:22 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

c5S7AzKt

Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2022/12496009

**Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación**

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
07	2022	12992177-3	Juan Carlos Herrera Herrera
07	2022	15934921-7	Alejandra Elena Ganter Horst
07	2022	17213872-1	Marcello Paolo Rondanelli Padilla
07	2022	17957622-8	Pedro David Terrazas Mardones
07	2022	18294438-6	Enzo Ariel Leiva Aravena
07	2022	18612970-9	Kevin Jochua Mejias Bustos
07	2022	19038565-5	Daniel Ignacio Salgado Ceron
07	2022	19418794-7	Hemaldo Piero Nunez Parada
07	2022	19463683-0	Marcela Alejandra Aguilera Clouet
07	2022	20144641-4	Catalina Alejandra Cordero Huenuman
07	2022	21161940-6	Damaris Virginia Ferreira Sepulveda
07	2022	25682820-0	Adrian Kvesic
07	2022	6547259-7	Edmundo Adolfo Ganter Parga

TOTAL DE TRABAJADORES:13

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460 - 7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259 - 7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
Miraflores 222 piso 28		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	(2) 222047174
CORREO ELECTRÓNICO		
WETLAND@WETLAND.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 31/08/2022 , siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesonline/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

eT19N3z1

AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



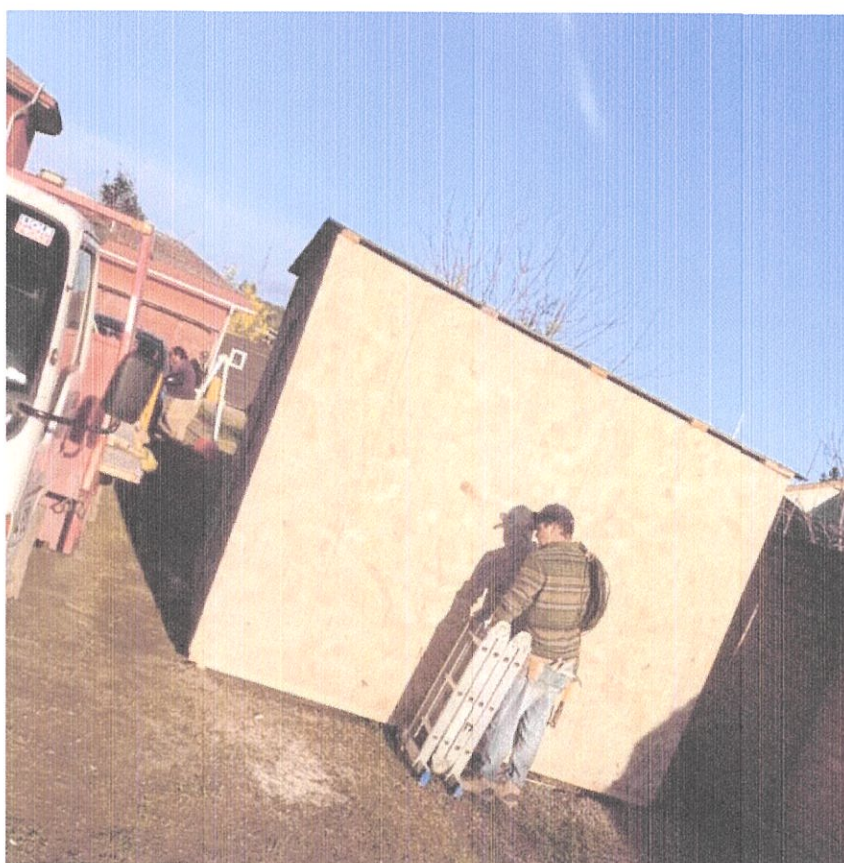


Ilustración 9: "Instalación bodegas Posta Quelentaro y Escuela Quelentaro"



Ilustración 10:"Excavaciones y nivelado Escuela Quelentaro"



Ilustración 11: "Bomba descarga tratamiento primario Escuela Quelentaro"



Ilustración 12: "Bomba de descarga reactor Escuela Quelentaro"



Ilustración 13: "Difusores de burbuja gruesa funcionando en digester Escuela Quelentaro"



Ilustración 14: "Agua tratada con sistema provisorio en Escuela Quelentaro"



Ilustración 15: "Soplador en digestor Escuela Quelentaro"
