

ESTADO DE PAGO N° 3

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E. DE PAGO N°	3
VALOR E. DE PAGO	\$ 42.841.559
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	12-10-2022
AVANCE FISICO %	46,84%
AVANCE FINANCIERO %	46,84%

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE

UBICACIÓN: Litueche, VI Región del Gral. Libertador Bernardo O'Higgins

CONTRATISTA: WETLAND S.A. RUT: 77.682.460-7

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° : 811 DE: 21 DE JULIO DE 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21-07-2022	PLAZO 148 DIAS	FECHA DE TERMINO 16-12-2022
	MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO :

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :

MONTO TOTAL :

\$	229.055.314
\$	-
\$	229.055.314

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	46,84%		\$ 107.291.392
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	28,14%		\$ 64.449.834
VALOR DEL PTE. E.P.			\$ 42.841.559
DESCUENTOS			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 42.841.559
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 42.841.559
LIQUIDO A PAGAR		0	\$ 42.841.559

CONTRATISTA

Marcello Rondanelli Padilla

ITO

Genaro Soto Barreda



Genaro Soto Barreda

WETLAND SOCIEDAD ANONIMA

Giro: CONS.OBRAS SANIT.Y ALCANT.PLANTAS

TRAT.RES.SOL.Y LIQ, ASESORIAS

Miraflores 222 PISO 28- SANTIAGO

eMail : GRUPO_CT5@GGLOBAL.CL Telefono : 2

9282500

TIPO DE VENTA: DEL GIRO


R.U.T.:77.682.460- 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº554****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago 3 Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche ID 1743-68-LQ22. ID 6203210701-C.	1	36.001.310			36.001.310

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	36.001.310
I.V.A. 19%	\$	6.840.249
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.841.559

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



02-09-2022

NOMBRE DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
R.U.T:MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE
WETLAND S.A
77.682.460-7

ESTADO DE PAGO Nº	3
VALOR E. DE PAGO	\$ 42.841.559

Total c/vsa \$ 42.841.559

ITEM	ITEMS O PARTIDAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD OBRAS CONTRATADAS	OBRAS EJECUTADAS	PRECIOS UNITARIOS	OBRAS EJECUTADAS AL PRESENTE ESTADO DE PAGO		MONTO DE OBRAS EJECUTADAS HASTA E.P. ANTERIOR	MONTO PRESENTE ESTADO DE PAGO
						\$/UNIDAD	\$		
1	INSTALACIONES PROVISORIAS								
1.1	Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad, SS HH)	unl	1	100%	\$ 1.731.487,00		\$ 1.731.487,00	\$ 1.731.487,00	\$ -
1.2	INSTALACIÓN DE FAENA								
1.2.1	Oficina 9m2	unl	3	100%	\$ 750.000,00		\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ -
1.2.2	Bodega 12m2	unl	3	100%	\$ 850.000,00		\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ -
1.3	Cierres Provisionales	ml	200	100%	\$ 14.000,00		\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ -
1.4	GASTOS ADICIONALES								
1.4.1	Letrero de Obra	unl	3	100%	\$ 550.000,00		\$ 1.650.000,00	\$ 1.650.000,00	\$ -
2	TRABAJOS PREVIOS								
2.1	OBRAS PREVIAS								
2.1.1	Demolición, Extracción, Retiro de Excedentes y Transporte a Botadero	m3	176,0	100%	\$ 89.236,00		\$ 15.705,536	\$ 11.779.152,00	\$ 3.926.384
2.1.2	Desmalezado, Emparjado y Limpieza de Terreno	m2	90,0	100%	\$ 25.090,00		\$ 2.258.100	\$ 1.693.575,00	\$ 564.525
2.1.3	Trazados y Niveles	m2	48,0	75%	\$ 9.555,00		\$ 343.980	\$ 229.320,00	\$ 114.660
2.1.4	Excavaciones	m3	50,0	75%	\$ 74.688,00		\$ 2.800,050	\$ 1.866.700,00	\$ 933.350
3	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION								
A	PTAS Paso Del Soldado								
3.1	Tratamiento Primario								
3.1.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	unl	2,0	0%	\$ 503.526,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.1.2	Pera de nivel MAC3 o similar	unl	2,0	0%	\$ 29.896,31		\$ -	\$ -	\$ -
3.2	Reactores SBR								
3.2.1	Soplador Repicky R100 o similar	unl	2,0	0%	\$ 2.587.000,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.2.2	Diffusores de burbuja fina SSI 9" AF270 o similar	unl	8,0	0%	\$ 29.549,11		\$ -	\$ -	\$ -
3.2.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	unl	1,0	0%	\$ 503.526,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.2.4	Pera de nivel MAC3 o similar	unl	3,0	0%	\$ 29.896,31		\$ -	\$ -	\$ -
3.2.5	Conjunto válvula electro actuada y actuador eléctrico 3 vías 1½" GENE	unl	1,0	0%	\$ 1.456.692,91		\$ -	\$ -	\$ -
3.3	Desinfección								
3.3.1	Bomba dosificadora Elatron PCK/MA o similar	unl	2,0	0%	\$ 190.385,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.3.2	Estanque de reactivo bión polietileno 60 Lts o similar	unl	2,0	0%	\$ 325.900,30		\$ -	\$ -	\$ -
3.3.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	unl	1,0	0%	\$ 419.985,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.4	Otros								
3.4.1	Tablero de fuerza y control						\$ -	\$ -	\$ -
3.4.1.1	PLC	unl	1,0	0%	\$ 7.290.946,58		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.1.2	Gabinete	unl	1,0	0%	\$ 528.094,66		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.1.3	HMI	unl	1,0	0%	\$ 1.984.283,97		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.1.4	Protectores térmicos	unl	9,0	0%	\$ 251.869,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.1.5	Relés	unl	8,0	0%	\$ 196.664,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación								
3.4.2.1	Inoculación	unl	1,0	0%	\$ 700.000,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2.2	Puesta en Marcha						\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	unl	1,0	0%	\$ 1.710.973,20		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	unl	1,0	0%	\$ 1.497.101,55		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2.2.3	Pruebas y Recepción	unl	1,0	0%	\$ 1.069.368,25		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.2.3	Capacitación	unl	1,0	0%	\$ 300.000,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.4.3	Transporte estanques y equipos	unl	1,0	100%	\$ 1.086.364,34		\$ 1.086.364	\$ -	\$ 1.086.364
B	PTAS Escuela Quelemtaro								
3.5	Tratamiento Primario								
3.5.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	unl	2,0	100%	\$ 503.526,00		\$ 1.007.052	\$ 1.007.052,00	\$ -
3.5.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	unl	2,0	100%	\$ 26.557,36		\$ 53.115	\$ 53.115	\$ -
3.5.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GENE	unl	2,0	100%	\$ 931.132,61		\$ 1.862.265	\$ 1.862.265	\$ -
3.6	Reactores SBR								
3.6.1	Soplador Repicky R100 o similar	unl	1,0	100%	\$ 2.587.000,00		\$ 2.587.000	\$ 2.587.000	\$ -
3.6.2	Diffusores Burbuja fina SSI 9" o similar	unl	8,0	100%	\$ 29.549,00		\$ 236.392	\$ 236.392	\$ -
3.6.3	Pera de nivel MAC3 o similar	unl	2,0	100%	\$ 26.557,36		\$ 53.115	\$ 53.115	\$ -
3.6.4	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GENE	unl	1,0	100%	\$ 1.456.693,00		\$ 1.456.693	\$ -	\$ 1.456.693
3.6.5	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	unl	2,0	100%	\$ 503.526,00		\$ 1.007.052	\$ 503.526,00	\$ -
3.7	Radier Desinfección								
3.7.1	Hormigón H-25	m3	3,1	100%	\$ 280.000,00		\$ 887.400	\$ 887.400	\$ -
3.7.2	Hierro estimado	kg	475,4	100%	\$ 5.250,00		\$ 2.495.850	\$ 2.495.850	\$ -
3.7.3	Excavaciones	m3	3,1	100%	\$ 74.687,62		\$ 228.544	\$ 228.544	\$ -
3.8	Desinfección								
3.8.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	unl	1,0	100%	\$ 419.985,00		\$ 419.985	\$ -	\$ 419.985
3.8.2	Bomba dosificadora Elatron PCK/MA o similar	unl	2,0	100%	\$ 199.394,99		\$ 398.790	\$ -	\$ 398.790
3.8.3	Pera de nivel MAC3 o similar	unl	2,0	100%	\$ 26.557,36		\$ 53.115	\$ -	\$ 53.115
3.8.4	Bidón polietileno 60 Lts o similar	unl	2,0	100%	\$ 193.009,85		\$ 386.014	\$ -	\$ 386.014
3.8.5	Estanques de fibra de vidrio 6m3	unl	1,0	100%	\$ 1.794.963,74		\$ 1.794.964	\$ -	\$ 1.794.964
3.9	Radier Espesador								
3.9.1	Hormigón H-25	m3	0,8	100%	\$ 280.000,00		\$ 234.900	\$ 234.900	\$ -
3.9.2	Hierro estimado	kg	122,9	100%	\$ 5.250,00		\$ 645.225	\$ 645.225	\$ -
3.9.3	Excavaciones	m3	0,8	100%	\$ 74.687,62		\$ 60.497	\$ 60.497	\$ -
3.10	Espeador								
3.10.1	Espeador de fibra de vidrio 1m3	unl	1,0	100%	\$ 521.118,50		\$ 521.119	\$ 521.119	\$ -
3.10.2	Bomba de descarga clarificado Zenit DG Blue 40 o similar	unl	1,0	100%	\$ 419.985,00		\$ 419.985	\$ -	\$ 419.985
3.10.3	Bomba de descarga todo Zenit DG Blue 75 o similar	unl	1,0	100%	\$ 503.526,00		\$ 503.526	\$ -	\$ 503.526
3.11	Digestor								
3.11.1	Soplador DVP CB 25 o similar	unl	1,0	100%	\$ 1.997.775,34		\$ 1.997.775,34	\$ -	\$ -
3.11.2	Diffusores Burbuja Gruesa SSI o similar	unl	2,0	100%	\$ 17.529,00		\$ 35.058	\$ 35.058,00	\$ -
3.12	Otros								
3.12.1	Tablero de fuerza y control								
3.12.1.1	PLC	unl	1,0	100%	\$ 2.330.946,58		\$ 2.330.947	\$ -	\$ 2.330.947
3.12.1.2	Gabinete	unl	1,0	100%	\$ 528.094,66		\$ 528.095	\$ -	\$ 528.095
3.12.1.3	HMI	unl	1,0	100%	\$ 1.984.283,97		\$ 1.984.284	\$ -	\$ 1.984.284
3.12.1.4	Protectores térmicos	unl	9,0	100%	\$ 251.869,00		\$ 2.266.821	\$ -	\$ 2.266.821
3.12.1.5	Relés	unl	11,0	100%	\$ 196.664,00		\$ 2.185.304	\$ -	\$ 2.185.304
3.12.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación								
3.12.2.1	Inoculación	unl	1,0	100%	\$ 700.000,00		\$ 700.000	\$ -	\$ 700.000
3.12.2.2	Puesta en Marcha						\$ -	\$ -	\$ -
3.12.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	unl	1,0	100%	\$ 3.894.748,40		\$ 3.894.748	\$ 608.554	\$ 3.286.194
3.12.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	unl	1,0	100%	\$ 3.407.904,85		\$ 3.407.905	\$ -	\$ 3.407.905
3.12.2.2.3	Pruebas y Recepción	unl	1,0	0%	\$ 2.434.217,75		\$ -	\$ -	\$ -
3.12.2.3	Capacitación	unl	1,0	100%	\$ 300.000,00		\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000
3.12.3	Transporte estanques y equipos	unl	1,0	100%	\$ 965.034,27		\$ 965.034	\$ -	\$ 965.034
C	PTAS Posta Quelemtaro								
3.13	Fosa Pulmón								
3.13.1	Hormigón H-25	m3	4,1	0%	\$ 280.000,00		\$ -	\$ -	\$ -
3.13.2	Hierro estimado	kg	865,8	0%	\$ 5.250,00		\$ -	\$ -	\$ -

3.13.3	Excavaciones	m3	5,8	0%	\$ 74.687,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14	Cámara de Bombeo								
3.14.1	Bomba de carga ZENIT DG Blue 50 o similar	unl	2,0	0%	\$ 434.402,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	unl	2,0	0%	\$ 28.746,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14.3	Hormigón H-25	m3	2,7	0%	\$ 979.266,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14.4	Fierro estimado	kg	486,5	0%	\$ 10.315,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14.5	Excavaciones	m3	2,9	0%	\$ 74.687,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.15	Radier SBR								
3.15.1	Hormigón H-25	m3	0,7	0%	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.15.2	Fierro estimado	kg	140,0	0%	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.15.3	Excavaciones	m3	0,7	0%	\$ 74.687,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16	Reactor SBR								
3.16.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 50 o similar	unl	2,0	0%	\$ 434.402,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16.2	Pera de nivel MAC3 o similar	unl	3,0	0%	\$ 28.746,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16.3	Conjunto válvula electroactuadora y actuador eléctrico GENEBRE 3 vías 1	unl	1,0	0%	\$ 1.456.663,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16.4	Soplador DVP CBB o similar	unl	1,0	0%	\$ 751.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16.5	Difusor SSI Burbuja fina 9" o similar	unl	2,0	0%	\$ 29.549,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.16.6	Estanque de fibra de vidrio 3,7 m3	unl	1,0	0%	\$ 1.063.692,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.17	Radier Desinfección								
3.17.1	Hormigón H-25	m3	0,6	0%	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.17.2	Fierro estimado	kg	117,6	0%	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.17.3	Excavaciones	m3	0,6	0%	\$ 74.687,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.18	Desinfección								
3.18.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	unl	1,0	0%	\$ 419.985,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.18.2	Bomba dosificadora Elatron PCK/MA o similar	unl	2,0	0%	\$ 199.395,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.18.3	Tambor polietileno 220 Lts o similar	unl	2,0	0%	\$ 268.916,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.18.4	Estanque de fibra de vidrio 2m3	unl	1,0	0%	\$ 940.123,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.19	Caseta de Máquinas								
3.19.1	Hormigón H-25	m3	4,7	0%	\$ 290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.19.2	Fierro estimado	kg	924,9	0%	\$ 5.250,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.19.3	Excavaciones	m3	16,3	0%	\$ 74.687,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20	Otros								
3.20.1	Tablero de fuerza y control								
3.20.1.1	PLC	unl	1,0	0%	\$ 3.280.946,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.1.2	Gabinete	unl	1,0	0%	\$ 529.094,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.1.3	HMI	unl	1,0	0%	\$ 1.584.263,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.1.4	Proteccion térmica	unl	8,0	0%	\$ 251.869,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.1.5	Relés	unl	8,0	0%	\$ 198.664,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación								
3.20.2.1	Inoculación	unl	1,0	0%	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.2.2	Puesta en Marcha								
3.20.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	unl	1,0	0%	\$ 3.107.712,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	unl	1,0	0%	\$ 2.719.248,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.2.2.3	Pruebas y Recepción	unl	1,0	0%	\$ 1.942.320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.3	Capacitación	unl	1,0	0%	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.20.4	Transporte estanques y equipos	unl	1,0	100%	\$ 1.044.582,12	\$ 1.044,582	\$ -	\$ -	\$ 1.044,582
4	ASEO Y ENTREGA								
4.1	Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno	unl	3	0%	\$ 850.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SUB TOTAL NETO	72.128,667	\$ 43.327.619,00	28.801,048
GASTOS GENERALES	10.615,300	\$ 6.499.143,00	4.520,157
UTILIDADES	7.212,867	\$ 4.332.762,00	2.880,195
TOTAL NETO	90.160,834	\$ 54.159.524,00	36.001,310
19% I.V.A.	17.130,558	\$ 10.290.310,00	6.840,249
SUBTOTAL CON I.V.A INCLUIDO	107.291,392	\$ 64.449.834,00	42.841,559





MARCELLO RONDANELLI P.
 REPRESENTANTE DE PROYECTOS Y OPERACIONES
 WETLAND S.A.
 R.U.T. 77.582.460-7

GERARDO SOTO B.
 DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES LITUÈCHE

GERARDO SOTO B.
 INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:

Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
2000	2022	12496009

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259-7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
miraflores 222		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
Mejoramiento 3 P.T.A.S Comuna de litueche		
DOMICILIO DE LA OBRA		
Cardenal caro 796		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCLADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	13

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
7	2022	13	21406867	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	Ilustre Municipalidad de Litueche	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631592-0	Rene Acuña Echeverría	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Cardenal Caro 796		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	22-209800

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el periodo comprendido entre 7/2022 y 7/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 18-08-2022 12:00:22 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

c5S7AzKt

Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2022/12496009

**Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación**

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
07	2022	12992177-3	Juan Carlos Herrera Herrera
07	2022	15934921-7	Alejandra Elena Ganter Horst
07	2022	17213872-1	Marcello Paolo Rondanelli Padilla
07	2022	17957622-8	Pedro David Terrazas Mardones
07	2022	18294438-6	Enzo Ariel Leiva Aravena
07	2022	18612970-9	Kevin Jochua Mejias Bustos
07	2022	19038565-5	Daniel Ignacio Salgado Ceron
07	2022	19418794-7	Hernaldo Piero Nunez Parada
07	2022	19463683-0	Marcela Alejandra Aguilera Clouet
07	2022	20144641-4	Catalina Alejandra Cordero Huenuman
07	2022	21161940-6	Damaris Virginia Ferreira Sepulveda
07	2022	25682820-0	Adrian Kvesic
07	2022	6547259-7	Edmundo Adolfo Ganter Parga

TOTAL DE TRABAJADORES:13

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460 - 7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259 - 7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
Miraflores 222 piso 28		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	(2) 942294327
CORREO ELECTRÓNICO		
WETLAND@WETLAND.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 21/10/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesonline/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

2Lf1y1K9

AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



ID: 1743-68-LQ22

MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA
LITUECHE

Fecha: 12/10/2022



Señores

Ilustre Municipalidad de Litueche
Dirección de Obras Municipales
PRESENTE

At. Sr. Genaro Donoso

Ref.: Registro fotográfico EP 3

Estimados Señores:

Junto con saludar adjunto registro fotográfico de los avances realizados a la obra para ser presentados según bases de licitación para estado de pago 3.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, le saluda cordialmente:


Edmundo Ganter P.
Director técnico
Wetland S.A.



Ilustración 1: "Vista PTAS Escuela Quelentaro"

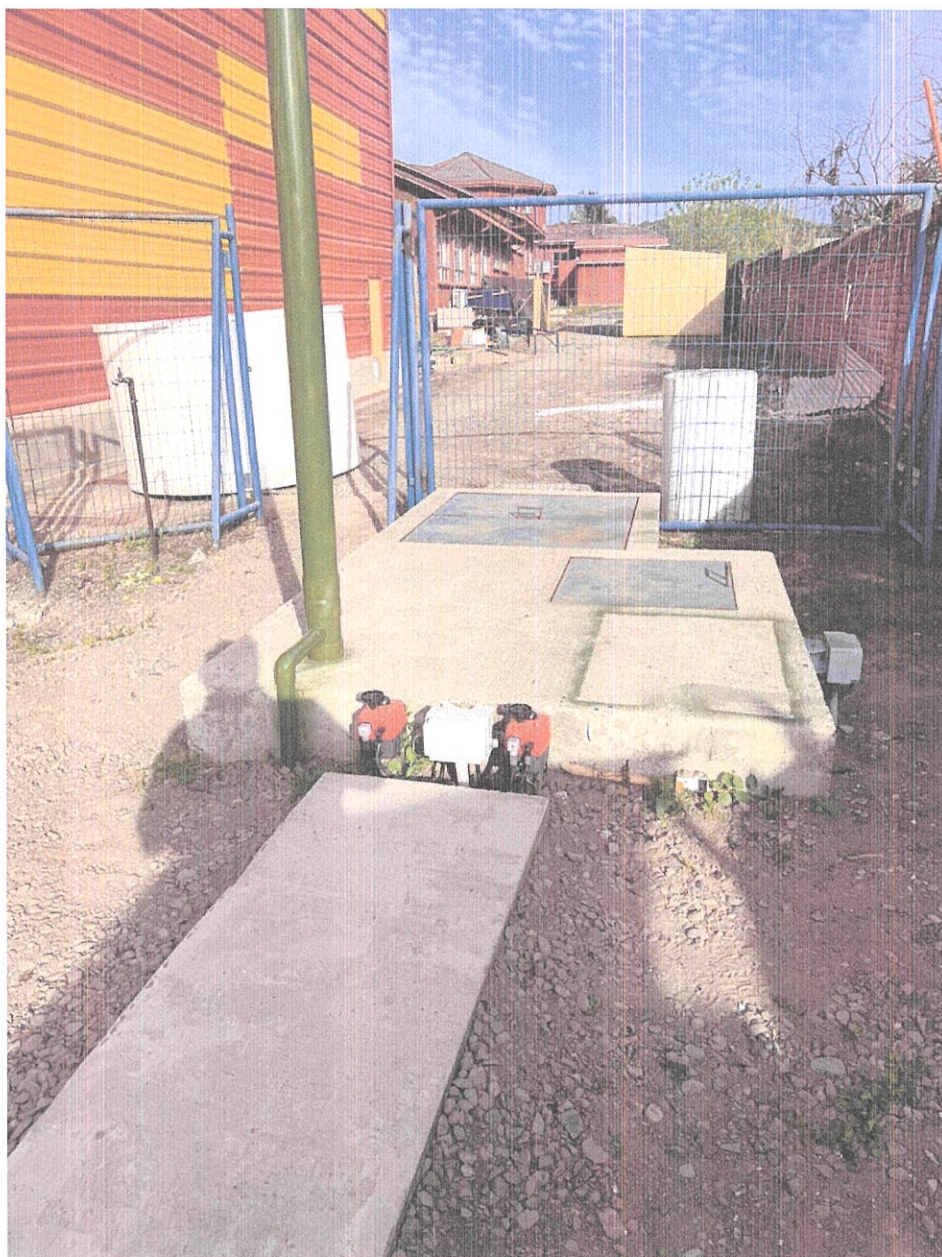


Ilustración 2: "Cámara Contacto funcionando PTAS Escuela Quelentaro"

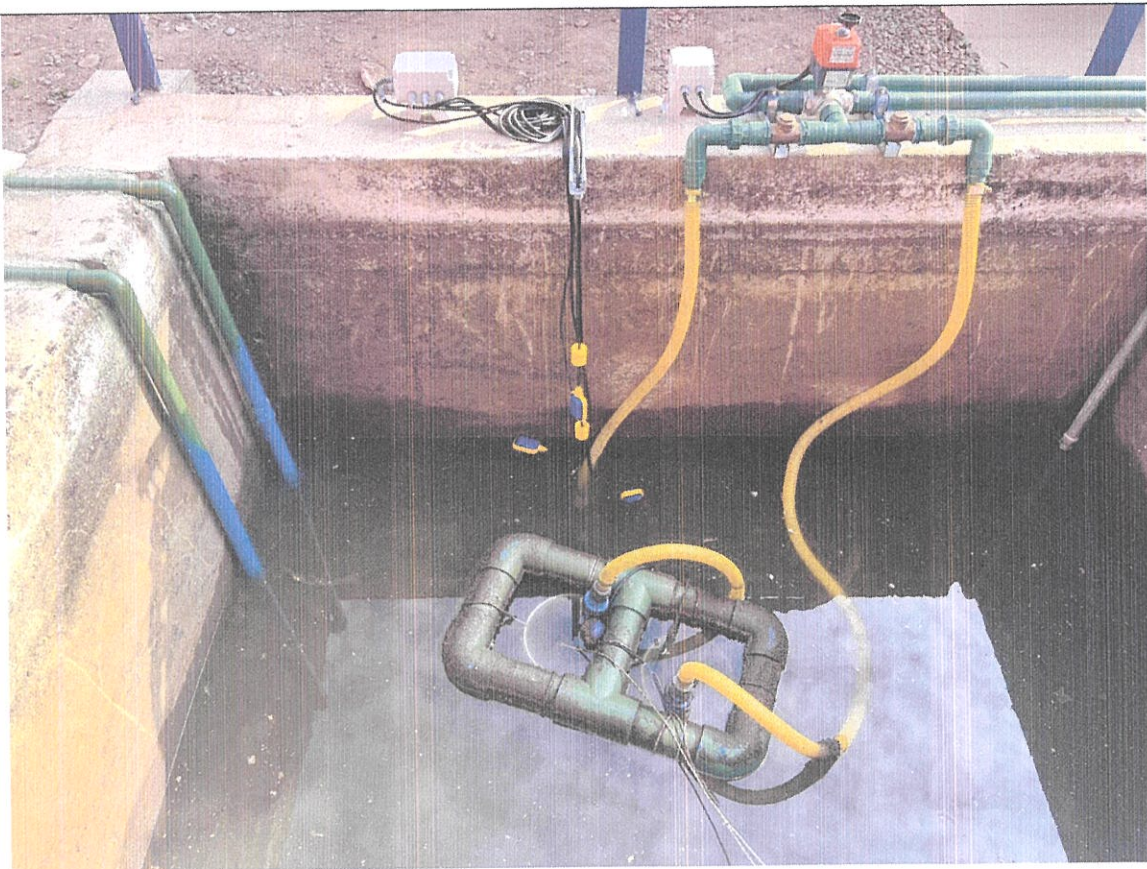


Ilustración 3:"Reactor SBR Escuela Quelentaro"



Ilustración 4: "Sopladores y PLC PTAS Escuela Quelentaro"



Ilustración 5: "Digestor Escuela Quelentaro"

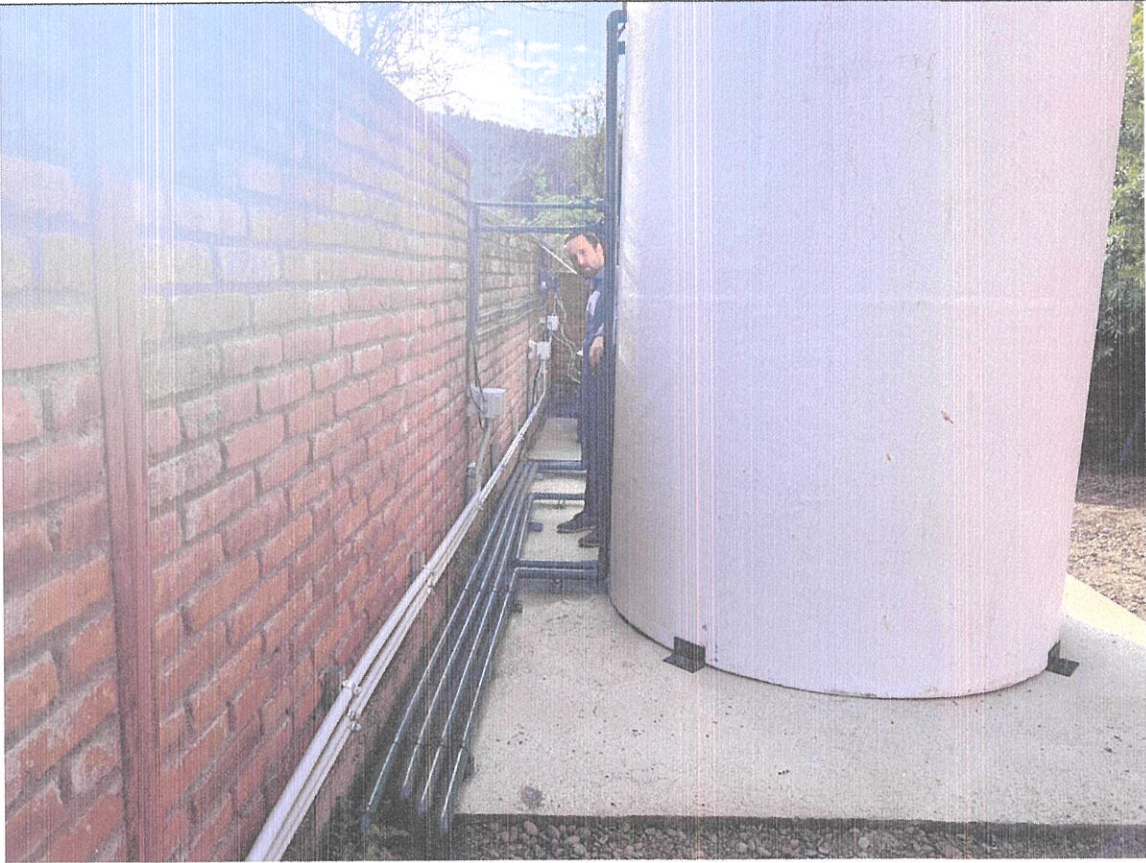


Ilustración 6: "Terminaciones eléctricas e hidráulicas PTAS Escuela Quelentaro "



Ilustración 7: "Estanque de desinfección y espesador de lodos Escuela Quelentaro"



Ilustración 8: "Bidones Metabisulfito e Hipoclorito PTAS Escuela Quelentaro "



Ilustración 9:" Terminaciones eléctricas e hidráulicas Escuela Quelentaro"

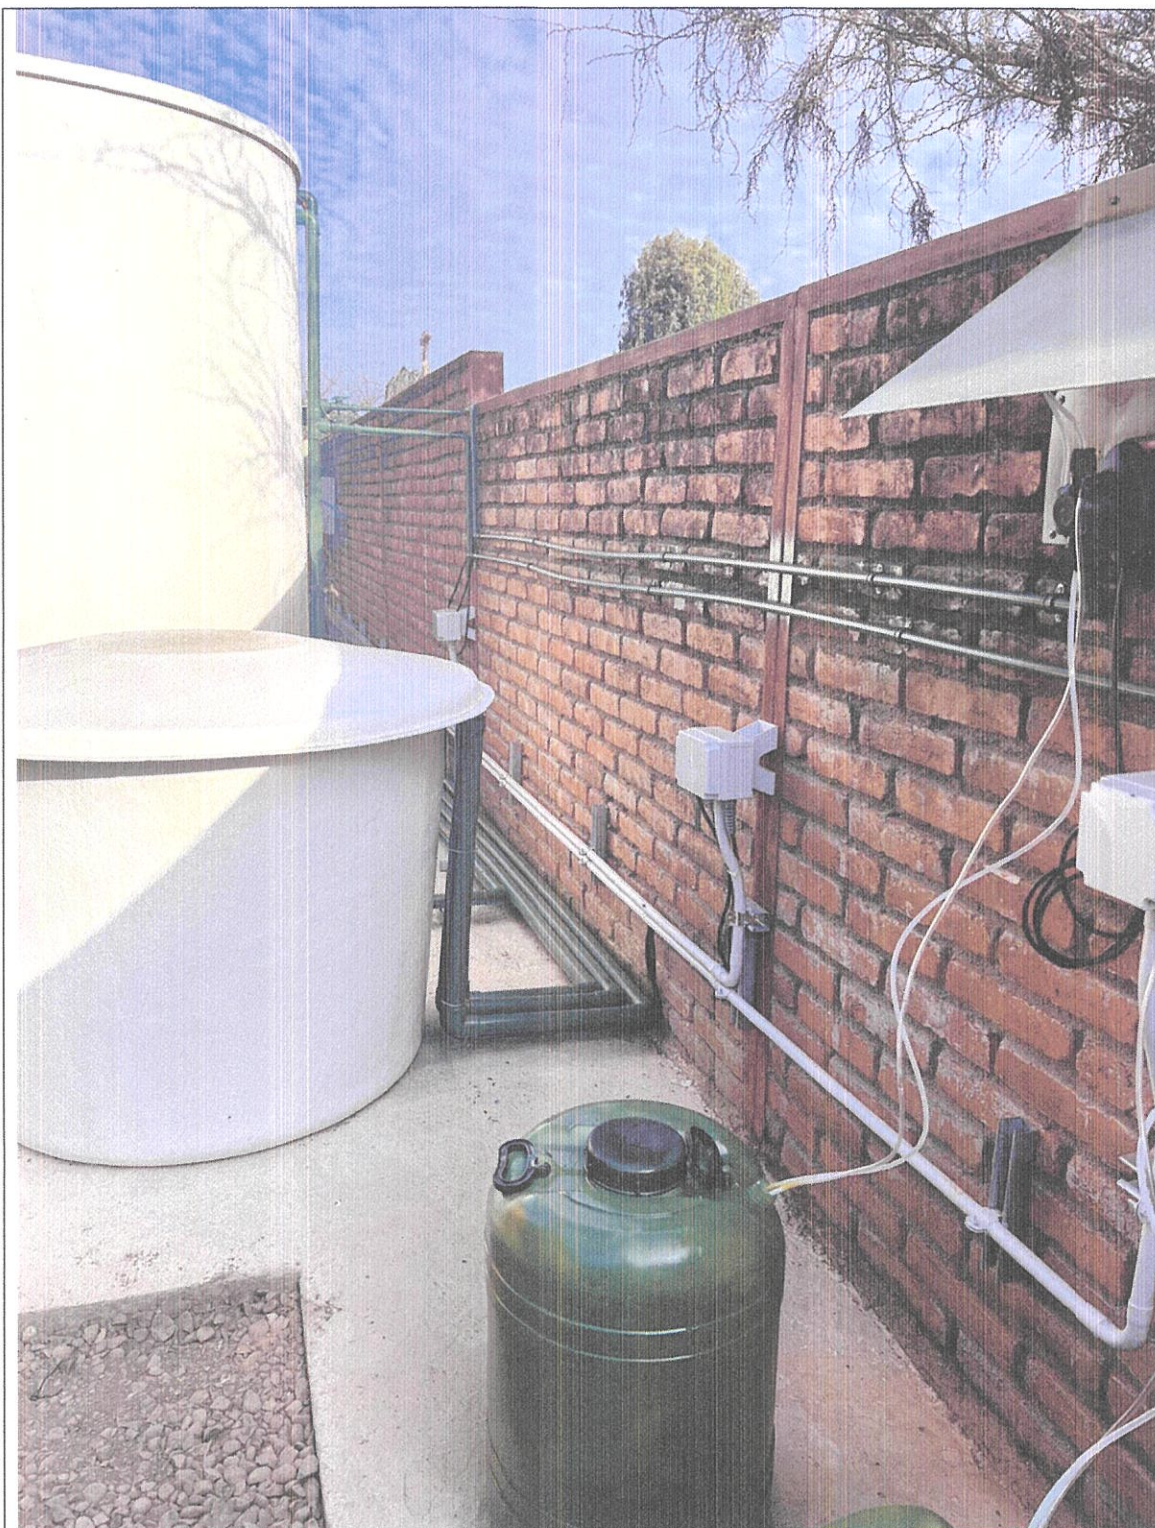


Ilustración 10:" Terminaciones eléctricas e hidráulicas Escuela Quelentaro"



Ilustración 11: "Acumulador de lodos PTASEscuela Quelentaro"
