

ESTADO DE PAGO N°5

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E. DE PAGO N°	5 y Final
VALOR E. DE PAGO	\$ 29.331.302
TIPO REAJUSTE	-
FECHA E. DE PAGO	10-04-2023
AVANCE FISICO %	100%
AVANCE FINANCIERO %	100%

NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE
UBICACIÓN:	Litueche, VI Región del Gral. Libertador Bernardo O'Higgins


CONTRATISTA:	WETLAND S.A
---------------------	-------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° : 811	DE: 21 DE JULIO DE 2022
---	--------------------------------

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21-07-2022	PLAZO 148 DIAS	FECHA DE TERMINO 16-12-2022
	MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO 25-01-2023

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 229.055.314
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :	\$ -
MONTO TOTAL :	\$ 229.055.314

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	\$ 229.055.314	\$ -	\$ 229.055.314
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	\$ 146.560.894	\$ -	\$ 146.560.894
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 82.494.420	\$ -	\$ 82.494.420
MULTAS	\$ 50.163.118	\$ -	\$ 50.163.118
SUB-TOTAL	\$ 32.331.302	\$ -	\$ 32.331.302
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000
SUB-TOTAL	\$ 29.331.302	\$ -	\$ 29.331.302
LIQUIDO A PAGAR	\$ 29.331.302	\$ -	\$ 29.331.302


CONTRATISTA
Osvaldo Herrera Sandoval
Jefe de Proyectos - Operaciones
P.P.: WETLAND S.A.


UTO
Genaro Soto Barreda



DOM
Genaro Soto Barred

WETLAND SOCIEDAD ANONIMAGiro: CONS. OBRAS SANIT. Y ALCANT. PLANTAS
TRAT. RES. SOL. Y LIQ, ASESORIAS

Miraflores 222 PISO 28- SANTIAGO

eMail : GRUPO_CT5@GGLOBAL.CL Telefono : 2
9282500

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.682.460- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº625

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

R.U.T.: 69.091.100- 0

GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC

DIRECCION: CARDENAL CARO 796

COMUNA LITUECHE


CIUDAD: LITUECHE

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago 5 y final MEJORAMIENTO 3 PTAS, COMUNA DE LITUECHE ID 1743-68-LQ22. ID 6203210701-C	1	66.802.034			66.802.034

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII


Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 66.802.034

I.V.A. 19% \$ 12.692.386

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 79.494.420



WETLAND
TECNOLOGÍA AMBIENTAL

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS AL

05-04-2023

NOMBRE DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE
CONTRATISTA: WETLAND S.A
R.U.T: 77.682.460-7

ESTADO DE PAGO Nº	5
VALOR E. DE PAGO	\$ 82.494.421

ITEM	ITEMS O PARTIDAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS DESIGNACION	UNIDAD	\$	CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS	OBRAS EJECUTADAS	OBRAS EJECUTADAS AL PRESENTE ESTADO DE PAGO		\$	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS HASTA E.P. ANTERIOR	MONTO PRESENTE ESTADO DE PAGO
						\$/UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS			
1	INSTALACIONES PROVISORIAS									
1.1	Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Elec	uni	1	100%	\$	1.731.487	\$	1.731.487	\$	-
1.2	INSTALACION DE FAENA									
1.2.1	Oficina 9m2	uni	3	100%	\$	750.000	\$	2.250.000	\$	-
1.2.2	Bodega 12m2	uni	3	100%	\$	850.000	\$	2.550.000	\$	-
1.3	Cierros Provisorios	ml	200	100%	\$	14.000	\$	2.800.000	\$	-
1.4	GASTOS ADICIONALES									
1.4.1	Letrero de Obra	uni	3	100%	\$	550.000	\$	1.650.000	\$	-
2	TRABAJOS PREVIOS									
2.1	OBRAS PREVIAS									
2.1.1	Demolicion, Extraccion, Retiro de Excedentes y Tra	m3	176,0	100%	\$	89.236	\$	15.705.536	\$	-
2.1.2	Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno	m2	90,0	100%	\$	25.090	\$	2.258.100	\$	-
2.1.3	Trazados y Niveles	m2	48,0	100%	\$	9.555	\$	458.640	\$	114.660
2.1.4	Excavaciones	m3	50,0	100%	\$	74.668	\$	3.733.400	\$	933.350
3	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION									
A	PTAS Paso Del Soldado									
3.1	Tratamiento Primario									
3.1.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o s	uni	2,0	100%	\$	503.526	\$	1.007.052	\$	-
3.1.2	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	100%	\$	29.896	\$	59.793	\$	-
3.2	Reactor SBR									
3.2.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	2,0	100%	\$	2.587.000	\$	5.174.000	\$	-
3.2.2	Difusores de burbuja fina SSI 9" AF270 o similar	uni	8,0	100%	\$	29.549	\$	236.393	\$	-
3.2.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	1,0	100%	\$	503.526	\$	503.526	\$	-
3.2.4	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	3,0	100%	\$	29.896	\$	89.689	\$	-
3.2.5	Conjunto válvula electro actuada y actuador eléctric	uni	1,0	100%	\$	1.456.693	\$	1.456.693	\$	-
3.3	Desinfección									
3.3.1	Bomba dosificadora Elatron PKX/MA o similar	uni	2,0	100%	\$	199.395	\$	398.790	\$	-

3.3.2	Estanque de reactivo bidón polietileno 60 Lts o sim	uni	2,0	100%	\$	325.909	\$	651.819	\$	651.819	\$	-
3.3.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	100%	\$	419.985	\$	419.985	\$	419.985	\$	-
3.4	Otros				\$		\$		\$		\$	-
3.4.1	Tablero de fuerza y control											-
3.4.1.1	PLC	uni	1,0	100%	\$	7.280.947	\$	7.280.947	\$	7.280.947	\$	-
3.4.1.2	Gabinete	uni	1,0	100%	\$	528.095	\$	528.095	\$	528.095	\$	-
3.4.1.3	HMI	uni	1,0	100%	\$	1.584.284	\$	1.584.284	\$	1.584.284	\$	-
3.4.1.4	Protectores térmicos	uni	6,0	100%	\$	251.869	\$	1.511.214	\$	1.511.214	\$	-
3.4.1.5	Relés	uni	8,0	100%	\$	198.664	\$	1.589.312	\$	1.589.312	\$	-
3.4.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación				\$		\$		\$		\$	-
3.4.2.1	Inoculación	uni	1,0	100%	\$	700.000	\$	700.000	\$	700.000	\$	-
3.4.2.2	Puesta en Marcha											-
3.4.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1,0	100%	\$	1.710.973	\$	1.710.973	\$	1.710.973	\$	-
3.4.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1,0	100%	\$	1.497.102	\$	1.497.102	\$	1.497.102	\$	-
3.4.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1,0	100%	\$	1.069.358	\$	1.069.358	\$	-	\$	1.069.358
3.4.2.3	Capacitación	uni	1,0	100%	\$	300.000	\$	300.000	\$	-	\$	300.000
3.4.3	Transporte estanques y equipos	uni	1,0	100%	\$	1.086.364	\$	1.086.364	\$	1.086.364	\$	-
B	PTAS Escuela Quelentaro				\$		\$		\$		\$	-
3.5	Tratamiento Primario				\$		\$		\$		\$	-
3.5.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o s	uni	2,0	100%	\$	503.526	\$	1.007.052	\$	1.007.052	\$	-
3.5.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	uni	2,0	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.5.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctric	uni	2,0	100%	\$	931.133	\$	1.862.265	\$	1.862.265	\$	-
3.6	Reactores SBR				\$		\$		\$		\$	-
3.6.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	1,0	100%	\$	2.587.000	\$	2.587.000	\$	2.587.000	\$	-
3.6.2	Diffusores Burbuja fina SSI 9" o similar	uni	8,0	100%	\$	29.549	\$	236.392	\$	236.392	\$	-
3.6.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.6.4	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctric	uni	1,0	100%	\$	1.456.693	\$	1.456.693	\$	1.456.693	\$	-
3.6.5	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	2,0	100%	\$	503.526	\$	1.007.052	\$	1.007.052	\$	-
3.7	Radier Desinfección				\$		\$		\$		\$	-
3.7.1	Hormigón H-25	m3	3,1	100%	\$	290.000	\$	887.400	\$	887.400	\$	-
3.7.2	Fierro estimado	kg	475,4	100%	\$	5.250	\$	2.495.850	\$	2.495.850	\$	-
3.7.3	Excavaciones	m3	3,1	100%	\$	74.688	\$	228.544	\$	228.544	\$	-
3.8	Desinfección				\$		\$		\$		\$	-
3.8.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1,0	100%	\$	419.985	\$	419.985	\$	419.985	\$	-
3.8.2	Bomba dosificadora Elatron PKX/MA o similar	uni	2,0	100%	\$	199.395	\$	398.790	\$	398.790	\$	-
3.8.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2,0	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.8.4	Bidón polietileno 60 Lts o similar	uni	2,0	100%	\$	193.007	\$	386.014	\$	386.014	\$	-
3.8.5	Estanque de fibra de vidrio 6m3	uni	1,0	100%	\$	1.794.964	\$	1.794.964	\$	1.794.964	\$	-
3.9	Radier Espesador				\$		\$		\$		\$	-
3.9.1	Hormigón H-25	m3	0,8	100%	\$	290.000	\$	234.900	\$	234.900	\$	-
3.9.2	Fierro estimado	kg	122,9	100%	\$	5.250	\$	645.225	\$	645.225	\$	-
3.9.3	Excavaciones	m3	0,8	100%	\$	74.688	\$	60.497	\$	60.497	\$	-
3.10	Espeador				\$		\$		\$		\$	-
3.10.1	Espeador de fibra de vidrio 1m3	uni	1,0	100%	\$	521.119	\$	521.119	\$	521.119	\$	-
3.10.2	Bomba de descarga clarificado Zenit DG Blue 40 o	uni	1,0	100%	\$	419.985	\$	419.985	\$	419.985	\$	-
3.10.3	Bomba de descarga lodo Zenit DG Blue 75 o simila	uni	1,0	100%	\$	503.526	\$	503.526	\$	503.526	\$	-
3.11	Digestor				\$		\$		\$		\$	-
3.11.1	Soplador DVP CB 25 o similar	uni	1,0	100%	\$	1.997.775	\$	1.997.775	\$	1.997.775	\$	-

3.19.1	Hormigón H-25	m3	4,7	100%	\$	290.000	\$	1.368.800	\$	-	\$	1.368.800
3.19.2	Fierro estimado	kg	924,9	100%	\$	5.250	\$	4.855.725	\$	-	\$	4.855.725
3.19.3	Excavaciones	m3	16,3	100%	\$	74.688	\$	1.213.674	\$	-	\$	1.213.674
3.20	Otros				\$		\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1	Tablero de fuerza y control				\$		\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1.1	PLC	uni	1,0	100%	\$	3.280.947	\$	3.280.947	\$	-	\$	3.280.947
3.20.1.2	Gabinete	uni	1,0	100%	\$	528.095	\$	528.095	\$	-	\$	528.095
3.20.1.3	HMI	uni	1,0	100%	\$	1.584.284	\$	1.584.284	\$	-	\$	1.584.284
3.20.1.4	Protectores térmicos	uni	6,0	100%	\$	251.869	\$	1.511.214	\$	-	\$	1.511.214
3.20.1.5	Relés	uni	8,0	100%	\$	198.664	\$	1.589.312	\$	-	\$	1.589.312
3.20.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación				\$		\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.1	Inoculación	uni	1,0	100%	\$	700.000	\$	700.000	\$	-	\$	700.000
3.20.2.2	Puesta en Marcha				\$		\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1,0	100%	\$	3.107.712	\$	3.107.712	\$	-	\$	3.107.712
3.20.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1,0	100%	\$	2.719.248	\$	2.719.248	\$	-	\$	2.719.248
3.20.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1,0	100%	\$	1.942.320	\$	1.942.320	\$	-	\$	1.942.320
3.20.3	Capacitación	uni	1,0	100%	\$	300.000	\$	300.000	\$	-	\$	300.000
3.20.4	Transporte estanques y equipos	uni	1,0	100%	\$	1.044.582	\$	1.044.582	\$	1.044.582	\$	-
4	ASEO Y ENTREGA				\$		\$	-	\$	-	\$	-
4.1	Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno	uni	3	100%	\$	850.000	\$	2.550.000	\$	-	\$	2.550.000

SUB TOTAL NETO	\$	153.986.764	\$	98.528.332	\$	55.458.433
GASTOS GENERALES	\$	23.098.015	\$	14.779.250	\$	8.318.765
UTILIDADES	\$	15.398.676	\$	9.852.833	\$	5.545.843
TOTAL NETO	\$	192.483.455	\$	123.160.415	\$	69.323.041
19% I.V.A.	\$	36.571.856	\$	23.400.479	\$	13.171.378
SUBTOTAL CON I.V.A INCLUIDO	\$	229.055.314	\$	146.560.894	\$	82.494.421



GENARO SOTO BARREDA
DIRECTOR DE OBRAS

GENARO SOTO BARREDA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

[Signature]
OSVALDO HERRERA SANDOVAL
JEFE DE PROYECTOS - OPERACIONES
WETLAND S.A
R.U.T. 77.682.460-7

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77041977 - 8	ICCI SERVICIOS INTEGRALES SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
15375171 - 4	PATRICIO FELIPE LARRAIN MANZO	
DOMICILIO		
DECIMA AVENIDA 1210 1909		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SAN MIGUEL	(9) 89980232 [celular]
CORREO ELECTRÓNICO		
PLARRAIN.ICCI@GMAIL.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 19/04/2023, siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

M1w85H1j

AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes





DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:

Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
2000	2023	13526378

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77041977-8	ICCI SERVICIOS INTEGRALES SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
15375171-4	PATRICIO FELIPE LARRAIN MANZO	
DOMICILIO		
DECIMA AVENIDA #1210 DEPTO. #1909		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SAN MIGUEL	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
"MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S COMUNA DE LITUECHE".		
DOMICILIO DE LA OBRA		
"MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S COMUNA DE LITUECHE".		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	LITUECHE

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	3

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
3	2023	3	1230000	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	Ilustre Municipalidad de Litueche	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631592-0	René Acuña Echeverría	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Cardenal Caro 796		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	722-209800

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 3/2023 y 3/2023, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 04-04-2023 12:55:11 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

c5BXe3d7

Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2023/13526378

**Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación**

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
03	2023	15421308-2	DAVID MANUEL GONZALEZ CAVIEDES
03	2023	20047021-4	GIANFRANCO ANTONIO MELENDEZ HERRERA
03	2023	25968594-K	JUAN FERNANDO VELASQUEZ CASTAÑO

TOTAL DE TRABAJADORES:3

ID: 1743-68-LQ22

MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S.

COMUNA DE LITUECHE

Fecha: 10/04/2023




Señores
Ilustre Municipalidad de Malloa
Dirección de Obras
PRESENTE

Ref.: Registro fotográfico EP N°5 y Final

Estimados Señores:

Junto con saludar, adjunto registro fotográfico de los avances realizados a la obra para ser presentados según bases de licitación correspondiente al estado de pago N°5.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, le saluda cordialmente:




Osvaldo Herrera Sandoval
Jefe de Proyectos - Operaciones
Wetland S.A.










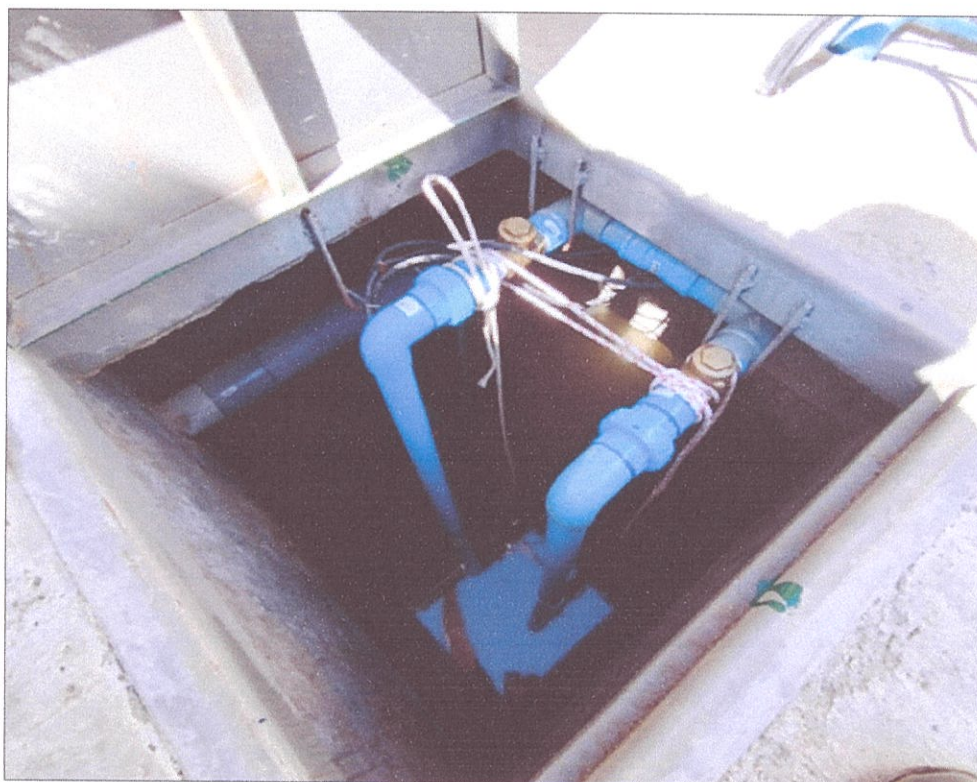

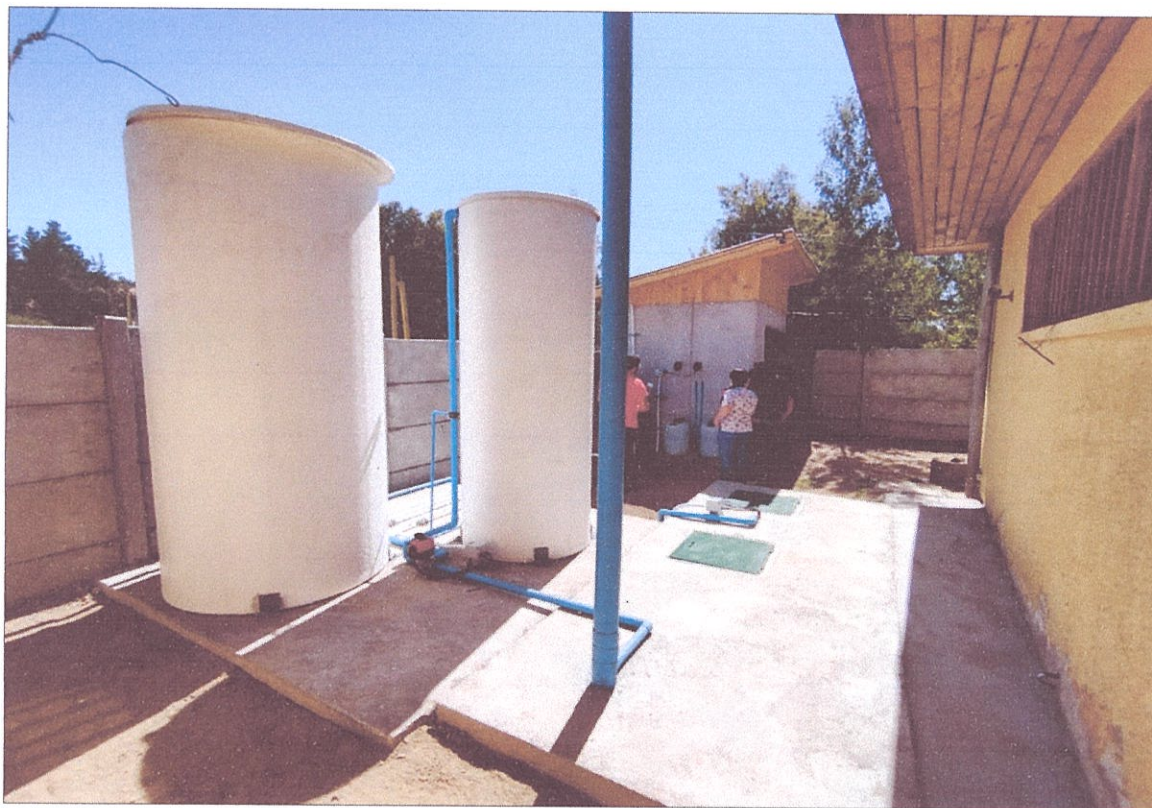
























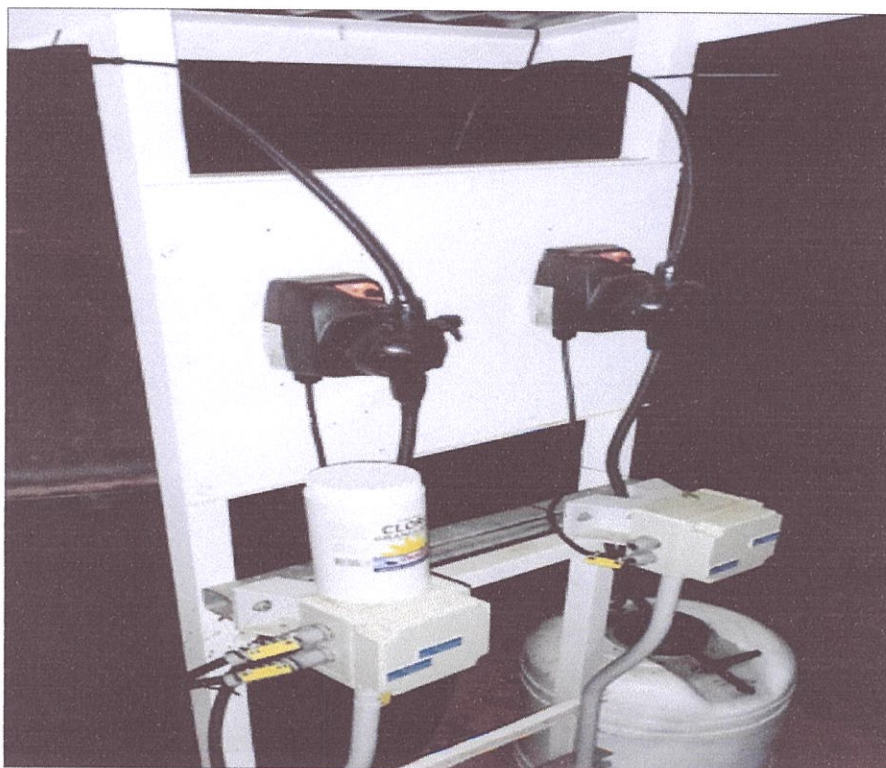

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460 - 7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259 - 7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
Miraflores 222 piso 28		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	(2) 949262657
CORREO ELECTRÓNICO		
CATALINA.CORDERO@WETLAND.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:

Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
2000	2023	13530235

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259-7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
Miraflores 222		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
Mejoramiento 3 P.T.A.S Comuna de litueche		
DOMICILIO DE LA OBRA		
Cardenal caro 796		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	3

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
3	2023	3	5082955	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	Ilustre Municipalidad de Litueche	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631692-0	Rene Acuña Echeverría	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Cardenal Caro 796		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	22-209800

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 3/2023 y 3/2023, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 05-04-2023 12:48:06 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

Et5o9DMe

Código de Verificación

CERTIFICADO	Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
2000/2023/13530235	certificación

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
03	2023	12992177-3	Juan Carlos Herrera Herrera
03	2023	16311117-9	Osvaldo Felipe Herrera Sandoval
03	2023	19038565-5	Daniel Ignacio Salgado Ceron

TOTAL DE TRABAJADORES:3

CERTIFICADO DE FIANZA
NOMINATIVO - NO ENDOSABLE - A LA VISTA - IRREVOCABLE
LEY N°20179



Certificado Fianza N°	112817WEB-F	
Afianzado:	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	R.U.T. N°: 77.682.460-7
Domicilio Afianzado:	Miraflores 222 piso 28, Santiago Región Metropolitana de Santiago	
Mandante:	Ilustre Municipalidad de Litueche	R.U.T. N°: 69.091.100-0
Domicilio Mandante:	Av. Obispo Eduardo Larraín sn, Litueche Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	
Fiador:	FINFAST S.A.G.R.	R.U.T. N°: 76.120.063-1
Domicilio Fiador:	Av. Providencia 1208 Piso 18, Providencia, Región Metropolitana.	
Cobertura FOGAPE Chile Apoya:	90%	

En la ciudad de Santiago a 10 del mes de abril de 2023, la sociedad administradora FINFAST S.A.G.R., en adelante el "fiador", representada por don Edmundo Pulido Mönckeberg y don Cristobal Brunetti Jequier emite este certificado en conformidad a las disposiciones de la Ley N°20.179, del 20 de junio de 2007, constituyéndose en este acto en fiador y codeudor solidario de WETLAND SOCIEDAD ANONIMA, en adelante "el Beneficiario", a favor de Ilustre Municipalidad de Litueche en adelante "el Mandante", con el objeto de garantizar a éste las siguientes obligaciones del beneficiario, en adelante "las Obligaciones Caucionadas".

COBERTURA

Fecha de Inicio:	10-04-2023	Fecha de Terminó:	31-10-2024
Monto Operación:	\$11.452.766	Finalidad:	Correcta Ejecución
PARA GARANTIZAR: Buena Ejecución de la Obra, Proyecto: "Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche"			

La Fianza de que da cuenta este certificado se extiende con cobertura 100% del monto de la obligación caucionada. La Fianza no goza del beneficio de excusión, en conformidad a lo establecido en la Ley N°20.179. Por otra parte, el Fiador renuncia en este acto, a los beneficios de división y a la excepción de subrogación, contemplados en los artículos 2.367 y 2.355, respectivamente, del Código Civil. El certificado será pagadero a primer requerimiento.

EVITE FRAUDES

Verifique la validez de la garantía en <https://finfast.com/verifyDocument> ingresando número del certificado y rut del afianzado

Los certificados emitidos a través de esta página, son otorgados bajo la Firma Electrónica Avanzada, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 y su Reglamento.

Powered by
 Firma electrónica avanzada
CRISTOBAL BRUNETTI JEQUIER
2023.04.10 12:23:57 -0400

Powered by
 Firma electrónica avanzada
JUAN PULIDO MONCKEBERG
2023.04.10 12:23:53 -0400
