



01

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA
CARDENAL PAUL SILVA HERNÁNDEZ.

UBICACIÓN: AVDA ORSITO GARCÍA LARAIN, ESCUELA
CARDENAL.

MANDANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINCHE, DEPTO
DE EDUCACIÓN

EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DE PROFESIONALES;
MARCIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, INGENIERO EN
Y CONSTRUCCIÓN; CARSTEN GARCÍA; PERDRA ELEC-
TRICIDAD INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA; REPRESENTANTE
UTP DON MARCIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

UNIDAD TÉCNICA: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

TIPO DE LICITACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

OFERTA ECONOMICA: \$ 25.204.199.-

FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DEL 2022.-

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE JUNIO DEL 2022

INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA: ALEJANDRO CÁRDENAS
CORDERO

PROFESIONAL DE LA OBRA: ROGER HIGUERA GONZÁLEZ,
MT 15.677.177-5

12 04 22

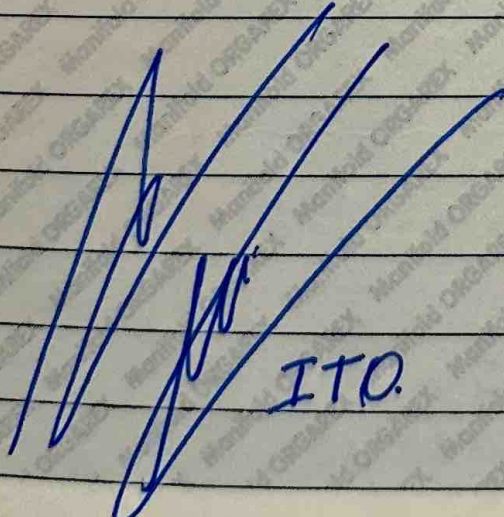


02

PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA
CANDEMA/ PAUL SILVA HERNANDEZ, LITICHÉ

A 11 DE ABRIL DEL 2022, SIENDO LAS 16:00 hrs
POR ESTE ACTO, EL JEFE (S) DEL DEPTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE LITICHÉ DON RAMÓN DOMINGO DIAZ,
PROCEDERÁ A REALIZAR ENTREGA DE TERMINO AL CONTRA-
TISTA SR. NARCISO GARCIA LEZ GONZALEZ INT. No. 686-
132-2, REPRESENTANTE DE LA UTP, PARA LA EJECU-
CIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN
ESCUELA CANDEMA/ PAUL SILVA HERNANDEZ, LITICHÉ." PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCrito
CON LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN EL PROceso DE
LICITACIÓN ID: 5124-10-LE 22.-

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 60 DÍAS CONTINUOS
PLAZO QUE SE INICIA EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA
DEL ACTO DE ENTREGA DE TERMINO.


ITO.

14 04 22




03

PROYECTO "HUMO DE CONTENCIÓN" ESCUELA CANDENI
PAUL SILVA HENRIQUEZ.

EN LA VISITA DEL DÍA 13 DE ABRIL EN COMPAÑÍA DEL REPRESENTANTE DE LA UTP SE PUEDE VER QUE EN EL LUGAR A TRABAJAR EXISTE HABITUALES UN ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES EL CUAL SE COMUNICA AL JEFE DAEN QUE ES NECESARIO CERRAR ESTE ESTACIONAMIENTO POR EL TIPO DE OBRERA DEL PROYECTO.

EN FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022. PORANTE ORDINARIO NO 58.- EL JEFE DAEN. INFORMA QUE EN EL PERIODO QUE DURA LA OBRA NO SE ESTACIONE NINGÚN VEHICULO EN EL AREA DE TRABAJO.


ITO

19 04 22

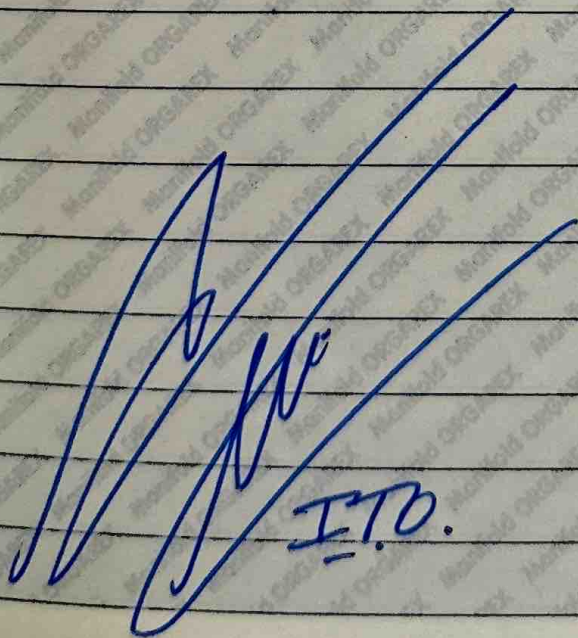


04

PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN. Gpr.
ESUELA CANDENAL PAUL SILVA HERNANDEZ.

1.- DE ACUERDO A LA PLAN METRICA NOBECTIVA SE
PUEDE VER QUE EL MURO PROYECTADO SUPLE LA LARGA DEL
MURO DE LA PARED EXISTENTE (MURO NORTE) PERO
CON LA FINALIDAD DE UTILIZAR DE NINGUNA MANERA EL
ESPACIO Y MUROS DE LA ESCUELA SE DECIDE MODIFI-
CAR LA UBICACIÓN DE ESTE MURO Y DESPLAZARLO APRO-
XIMADAMENTE 4,30 MTS HACIA EL OLIMPIASIO. ESTA MODI-
FICACIÓN NO CONSIDERA DISMINUCIÓN DE METROS, M² O
M³ DEL PROYECTO, SOLO SE MODIFICA EL EMPLEA-
MIENTO.

2.- EN LO QUE RESPECTA A LA OBRA EN SI, ESTA SE
ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANTILLO DE TALLO Y
EXPLORACIONES FUNDACIONES.


ITO.

27 04 22



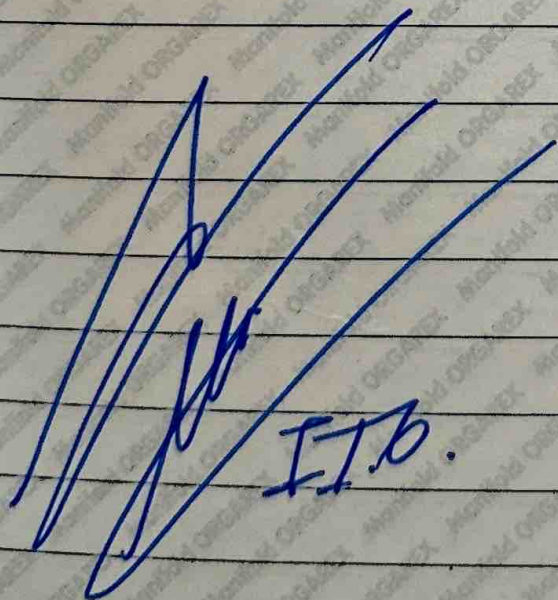
05

Proyecto Construcción muro de Contención
Gravado escuela C. R. S. H.

SE VISITA LA OBRA PARA CONFERENCIAR AVANCOS OBTENIDOS A LA FECHA.

1. SE ESTA TRABAJANDO EN LO QUE RESPECTA A LAS
FUNDAS 3.1.2. EXCAVACIONES FUNDACION, LA CUAL
ESTA EN SU ETAPA FINAL

2. SE ESTA CONVERSANDO CON EL PROFESIONAL DE
LA OBRA QUE SE DEBE DAR Vº Bº A LAS
EXCAVACIONES YND DE SON HORIZONALES.


I.T.B.

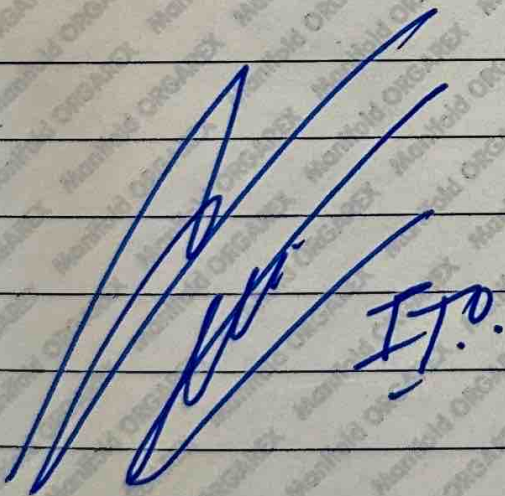
02 05 22



06

Proyecto construcción muro DE CONTENCIÓN Grmas.
SO EDUCLA C.R. S. H.

1 SE VA VOY A LAS EXCAVACIONES PARA DAR
PASO A LA PANTOA 3.2.1. Hombos H.D - Emplanti-
llado. 230 M² / m³.


I.T.O.

06 05 22.



Proyecto "Construcción Museo de Conservación
Gimnasio Escuela Cardenal Raúl Silva Henríquez.

1.- Se visita la obra en con Panin de don Roger
Higueras González. Profesional de la obra para
utilizar la misma como referente al ítem.

3.2.3. NOTIFICACIÓN DE HANGÓN - LUMINEROS AMBROS-
NIA ALMA C-1P6 + REFORZO FE BARR LA CUAL
SE VE DESNUDO EN ALTA ANARCE Y SIN OBSCU-
RA (CUAL).

ISO

11 05 22




08

Proyecto "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN
GRANDE EDIFICIO C.R. S. H.

1.- SE DA VOTO A LA ENTENDADURA DE CONVENIENTOS
PARA SE HANDEADO EL MISMO DIA 11 DE MAYO
DEL 2022, DE ACUERDO A LO EXPRÉSADO EN LOS
BET DEL PROYECTO.

2.- ASU VOT SE DGA INROLADO LA ENTENDADURA
COMO PADIENTE AL MURO DE CONTENCIÓN.

 Ito.

18 05 22



09

PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
CANAL ESUELA CARRETERA RAUL SILVA HERNANDEZ.

1. SE VISTA LA OBRA EN COMPARACION CON EL FOTORE-
SISTEMA DE LA OBRA PARA VER LAS PARTIDAS
3.2.4 malla ACMA C-257C Y 3.2.2. malla
J6, ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES.

ITO


27 05 22



10

Proyecto "Construcción muro de Contención
Esuela Cardenal Raúl Silva Henríquez."

Se visita la obra para ver y verificar la instalación de la Pajina 3.2.2. muros, encofrados y entibaciones, los materiales utilizados comparados a lo señalado en las EETT, se verifica la posición ~~de los~~ y los niveles de los encofrados, además de verificar en su no presencia Plomo. Puntualmente esta Pajina cuenta con el uso de la mano técnica por lo que esta encuestación de ser Homologada.



ITO.

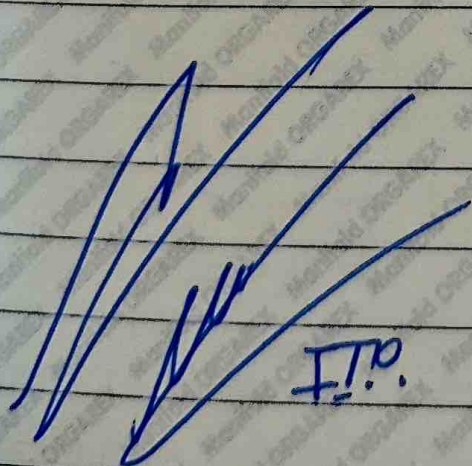
30 05 2022



Proyecto Construcción muro de contención Escuela
CANDENAL DAVID SILVA HERNANDEZ.

Con esta fecha se procede a ejecutar la PAVIMENTACIÓN
3.2.6.- HANGÓN H-30 Muro de contención de ALCANTARAL
A lo establecido en las EETT, esta PAVIMENTACIÓN SE
EJECUTA LA CAMBIO MIXTA POR LO QUE SE
DESARROLLA EN EL DÍA.

DE ALCANTARAL A LA MISMA DISPOSICIÓN DEL HANGÓN
EL HANGÓN H-30 (CLASIFICACIÓN ANTENA) AHORA CORRESPONDE
A UN HANGÓN G-25 (250 kg/cm^2)


I.T.O.

02 06 22



12

Proyecto "Construcción muro de contención obra
carretera rural Silva Henríquez."

1.- Con esta fecha se procede a comenzar con la
obra de Retiro de voladizo del muro de
contención.

2.- El plazo máximo de ejecución de la obra es
de 10 de junio del 2022.

3.- Objeto de las obras que se ejecutaran por
ejecución se será:

3.3.1.- Barridos y Paramos metálicos

4.1.1.- Aplicación de concreto estructural en elemen-
tos metálicos

4.1.2.- Aplicación de concreto metálico en
elementos metálicos

5.1 Limpieza de terreno.

ITA

10 06 22.



Proyecto construcción muro de contención en
calle N°1 Raúl Silva Henríquez.

- 1.- SE VISITA LA OBRA EN COMPAÑÍA DEL PROFESIONAL
DE ORDEN DON ROGER ALFONSO GONZALEZ, PARA
EVIDENCIAR LOS AVANCES A LA FECHA YA QUE HAY
QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2.- SE PONE LA OYE LA OBRA YA ESTÁ EJECUTADA,
SOLO FALTAN DETALLES EN LA PARTIDA 3.3.1 BARR-
RAS Y PARRAMONES METÁLICOS
- 3.- EL CONTRATISTA DEBE IMPRIMIR LA CARTA DE
SOLICITO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.

ITO.

17 06 23



14

Proyecto. Construcción muro de contención
Cruce Raúl Silva Henríquez.

En esta fecha se castiga la comisión necor-
ta a Efraim para proceder a necoriar
la obra, como esta, con necoración pro-
pura sin observaciones.

I.T.O.
