

21 07 2022



Con esta fecha se realiza la entrega del terreno de la obra "Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche".
El presente libro corresponde a la Planta de Tratamiento de Agua Servida del Post de Quelentaro.

- Duración obra: 148 días corridos.
- Proyecto: "Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche"
- Ubicación: Quelentaro S/N.
- Mandante: T. Municipalidad de Litueche
- Unidad Técnica: T. Municipalidad de Litueche
- Empresa Contratista: Wetland S.A.
- Tipo de Licitación: Pública
- Presupuesto Disponible: \$229.088.550
I.V.A. incluido.
- Perte económica: \$229.055.313
I.V.A. incluido.
- Fecha Inicio de obra: 22/07/2022.
- Fecha Término de obra: 16/12/2022.
- Inspector Técnico de obra: Genero Soto B.
- Referencia a cargo de la obra: Marcello Roderelli P.
Ing. Civil en O.C.C.

Genero Soto B.
I.T.O.

17 08 2022



Obra: Mejoramiento 3 PTAS, Comuna de Litueche", Poste Quelentano.

Si verifican omanos de obra en le 3 PTAS, instalar en fajas y lituras de obra.

Si este interviniera le Planta en le Estable y le Poste de Quelentano, en este último se este interseptando el flujo de aguas servidas hacia un reactor provisiono que instalo de Empresa WETLAND.

le Planta provisiono de tratamiento de aguas servidas descargo a un zanjón existente que lleve al Estero de Quelentano.

A large, stylized handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Genaro Soto B." is written in a smaller, more legible hand, followed by "I.T.O.".
Genaro Soto B.
I.T.O.

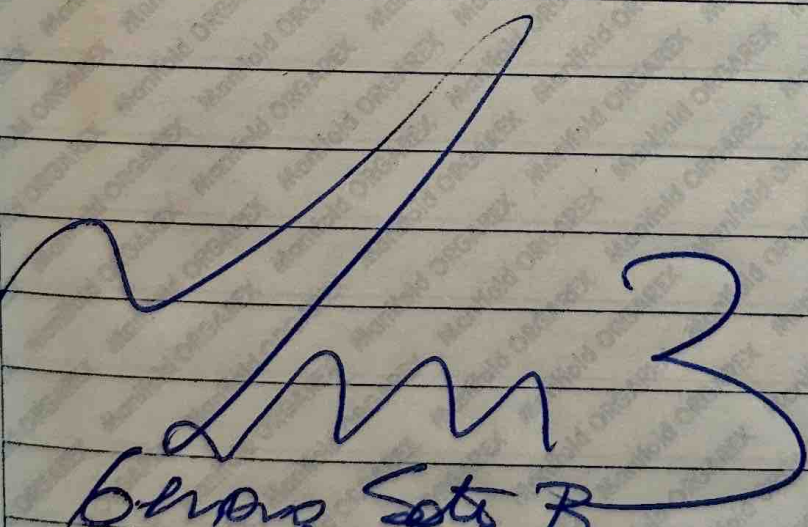
24 08 2022



Obra: "Mejoramiento 3 PTAS, Comuna de Litueche", Poste Andentano

* Se rutro el estanco que existe como ruato a la Planta de tratamiento existente en la Poste de Andentano.

* Es necesario recordar que el sistema fue intervenido, desargo agua tratada a través de un ruato provisiono.


Benigno Soto B.
J.T.O.

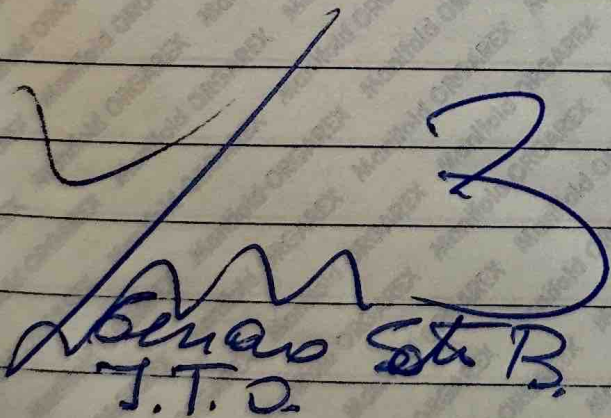
31 08 2022



che: "Mejoramiento 3 PTAS, ~~de~~ Litueche", ~~Exento~~ Poste Andentano

* Se observa infiltración ^{de agua} en la zona donde se excava y rutina el estorpe de la PTAS existente en la Poste

* La Empresa WETLAND debe revisar el ~~estado~~ el origen de las aguas, en principio no presentar algún tipo de olor



J. T. O.

09 09 2023



obra: 'Mipranienta 3 PTAS, de Litichén', Escuela Quintanilla

* Se instale una bomba superficial en la zona donde se encuentre agua o filtros en agua, ya que así se continúe el flujo del líquido, para de ahora o lo requiera esto no sea parte de una mopa frías o filtros de la red de agua potable de la Pto.


Benito Soto B.
J.T.O.

14 10 2022



Obra: "Mejoramiento 3 PTAS, Loma
de Litueche" Poste Quilentaro

* Se mantiene la infiltración en el Poste
de Quilentaro.

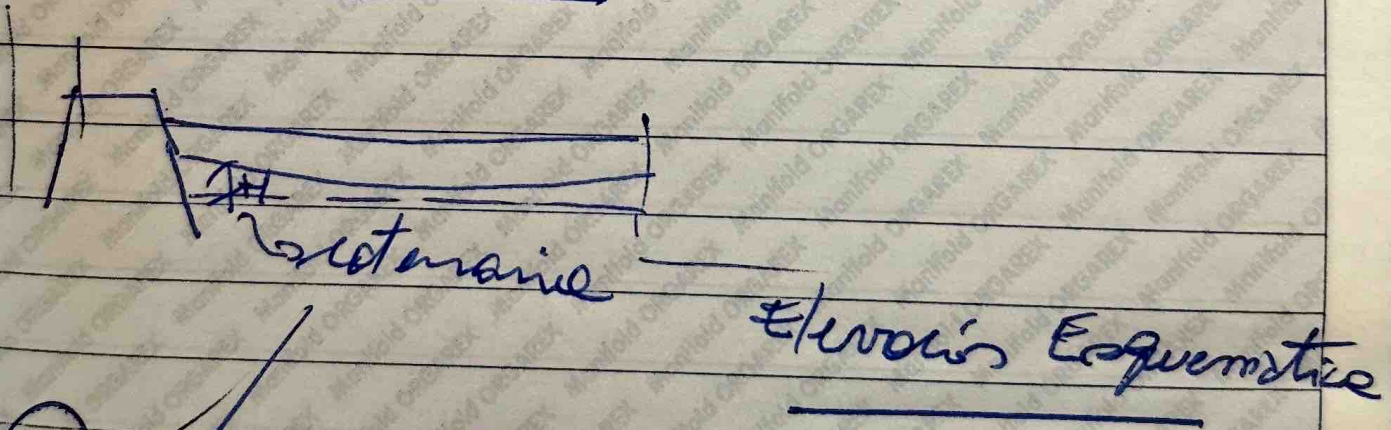
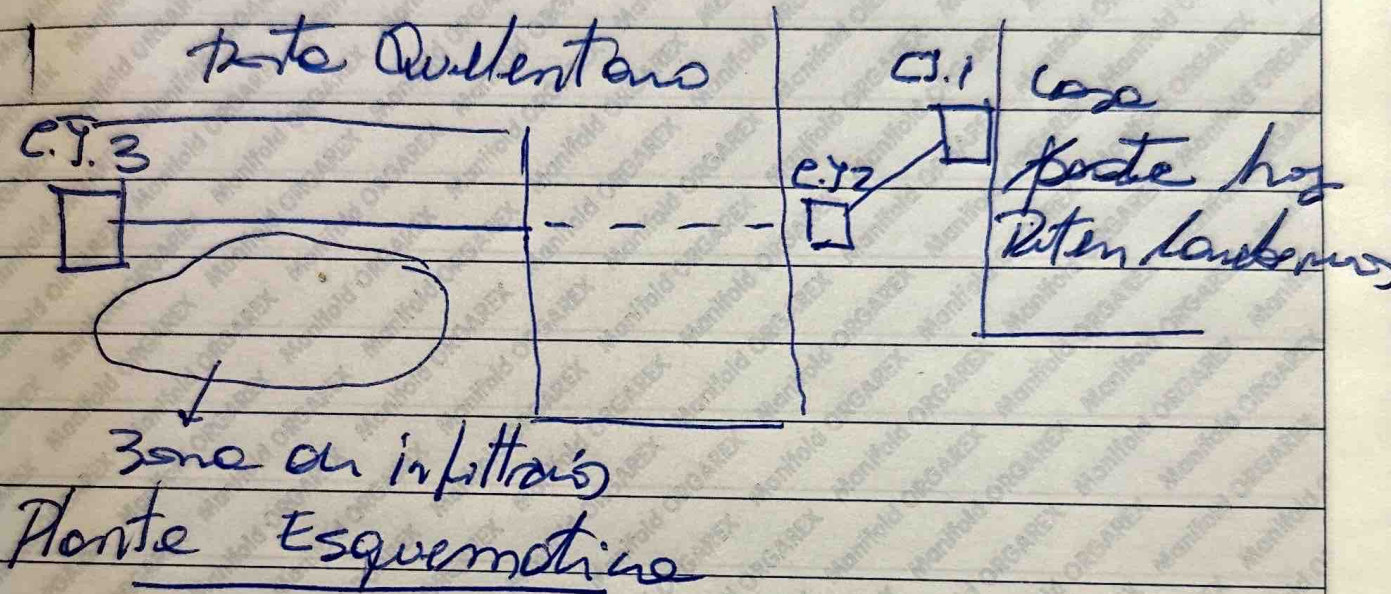
* La zona de la Poste que hoy es
ocupada por el Tatum de la carretera
al Chile, esta conectada a la
red del Alcantarillado de A.S. de
Poste, pero esta se repleta porque
la pendiente del colecto es menor
al 1%, esta situación se observa
cuando los lloviznos de invierno
del Tatum se sublevarán y las aguas
sucias fluirán a dar a la Multi-
loma que se encuentra a un
costado del edificio.

La red se destruye por el colecto
esto se con un tapero en el extremo
que conecta la red con la poste
de Quilentaro, al destapar con bariles
metálicos se logró determinar que
no fól que se generaban taperos
en la red producto de la pendiente
continúa en pag 7 —>

14 10 2022.



Viene de la pag 6
y ademas se observa que le toman
en una zona donde se encuentra,
generando una especie de loteria,
que permite tambien la filtracion
de liquidos



T.T.O


Genaro Soto B

30 10 2022



Asa: "Mipramentos 3 PTAS,
de Litwiche", Poste Oulentaro.

* No se observan mapas ovanos
en la construcción de la PTAS
de la Poste en Paso del Soldado


Emmano Soto B
I.T.O.

18 11 2022



obra: "Mejoramiento 3 PTAS, la zona de Linche", Rta de Quilontaro.

Se con fecha 08 de Noviembre al Sr. Marcello Mondonelli P, Gerente de Logística y Operación de WETLAND S.A, quien es el profesional responsable de la obra, mediante carta ingresada en la Oficina de partes con fecha 09 de Noviembre de 2022, indica que hace uso de su función legal desde el día 08 al 18 de Noviembre de 2022 y su reemplazo dejó al Sr. David Espada C, ingresa en Ingeniería Civil en Obras Civiles.

* A través de la Notificación N°44 de esta fecha se informa a la EMPRESA WETLAND S.A. que se aplicará una Multa por encontrarse la obra SIN PROFESIONAL Artículo 8, numeral 8.4.3 de la Base Administrativa Especiales.

continúa en pág 10 →

18 11 2022.



Venerable pag No 9 →

Se ha informado y se ha notificado
de sumita a través de e-mail
de este fide.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Germán Soto B

J.T.O

P.D: Se envia e-mail.

23 11 2022



Obr. "Mejoramiento 3 PTAS,
de Litueche"

* Se reintegra el Sr. Morillo Rondón-
Mi P. como protagonista a largo de
le obra el día 22/11/2022.

* Con este folio se surtieron las
3 PTAS, sobre todo las que
se encuentran ubicadas en Pano del
Soldado y la Escuela de Artes
y Oficios.

* La PTAS de la Rota se encuentran
sin movimiento.


Genaro Soto B
J.T.O

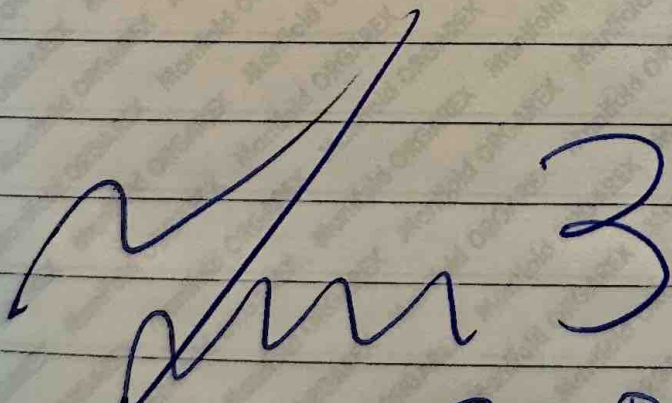
07/12/2022



Obra: "Mejoramiento 3 PTAS, con
de Litueche"

* La Empresa WETLAND S.A informa
de cumplimiento de profesional en cargo.
de la obra e cuentas de OS de
Diciembre de 2022.

* El profesional que cumple el requisito
de Sr. Marcelo Rondanelli P.,
a Name Osvaldo Herrera San-
donal, Impuesto Final.


Bruno Soto B
T.T.O.

14 12 2022



Pro: "Mejoramiento de 3 P.T.A.S.
de Litwani"

* La Empresa WETLAND S.A. solicita
suministro de plazo por 40 días
comidos a contar del 17 de noviem-
bre del 2022

* A la fecha totalice la Empresa
WETLAND S.A. no ha podido
realizar trabajos en la P.T.A.S. de
la Pista de Inventario, producto
de la infiltración de agua.

Gerardo Soto B.

J.T.O.

15 / 12 2022



Dep: "Mejoramiento 3 PTAS, de Litueche"

* Se autoriza aumento de plazo solicitado por la Empresa WETLAND S.A., mediante Informe N° 26 de fecha 15/12/2022, de acuerdo al Artículo 8.31 de los Bases Administrativas Especiales de la Licitación.

Se otorga un aumento de plazo de 40 días corridos e enteros, del 17 de Diciembre de 2022, hasta el 25 de Enero de 2023, ambos fechas inclusive.

* De acuerdo a lo anterior se hace un anexo modificatorio de contrato de fecha 15/12/2022 y Decreto N° 1371 de fecha 15/12/2022 que aprueba el anexo modificatorio.

Gerardo Soto B.

T.T.O.


20 12 2022



debe: Mejoramiento 3 PTAS,
de Litichén

* No se observan avances en la construcción de la PTAS de la Parte de Voluntario.

* Se recuerda a la Empresa UET-LAND S.A. que se encuentra con aumento de plazo al contrato de la obra, cuyo plazo vence el día 25 de Enero de 2023.


T.T.O.
Gerente Sot B

05 01 2023



Asunto: "Mejoramiento 3 PTAS, de Litueche"

4. En Avances en la Pista de Aventuro.

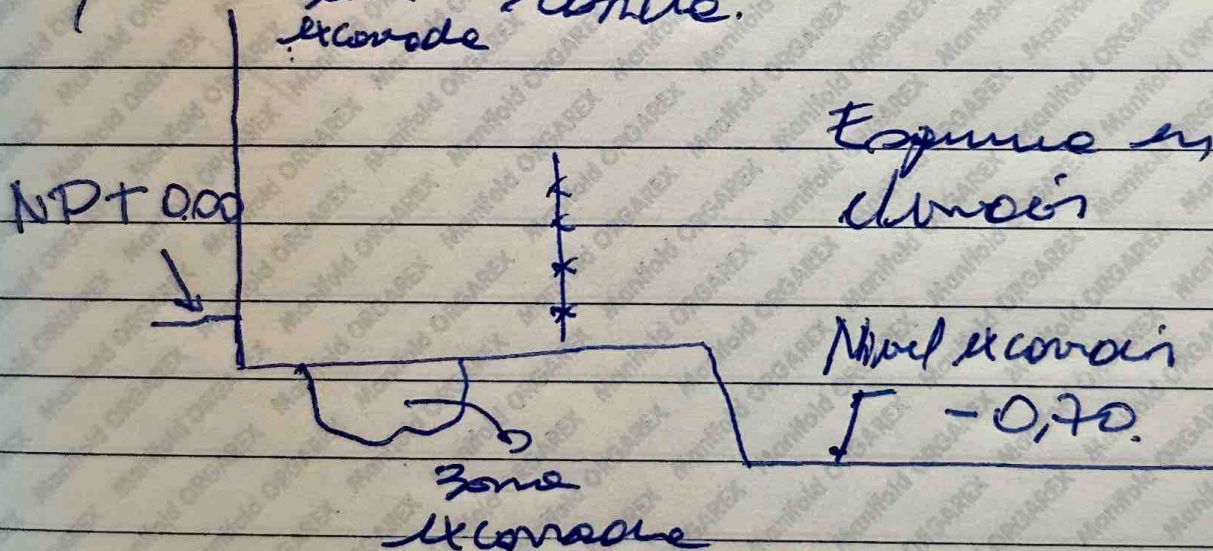
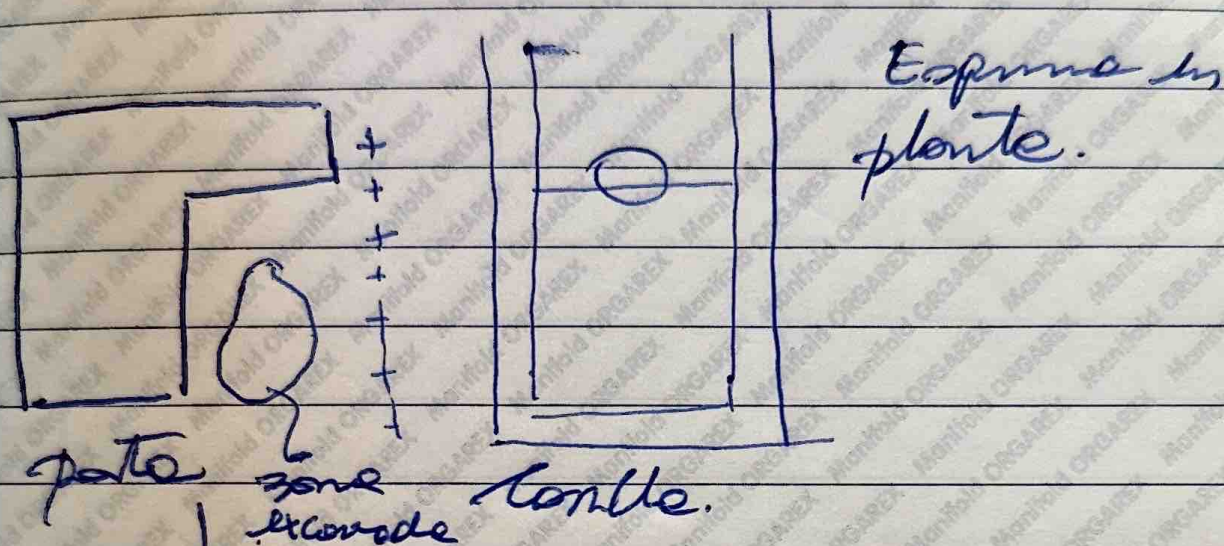
No se describe la construcción de las obras, líneas que considere el proyecto, tampoco hay una explicación plausible de la Empresa, ya que los únicos puntos planteados es que hay una granja frutícola al costado por lo tanto se debe intervenir el terreno con obras complementarias. Por permitir primer estas aguas situadas por las redes desmontadas por lo que se obra en el costado, de hecho se construye el Estadio Mariposante. y se realizará excavaciones para fundar el raíl de la cancha, considerando como cota de referencia el plano de la Pista 0,00, la profundidad del Estadio 11,50 e -0,70, porque el nivel de la cancha es más alta en pag 17 →

05 01 2023



Plan de proyecto 16

Plan de obra



Handwritten signature and the number 3.

Gerardo Soto B

J.T.O

12 01 2023



duo: 1 Migrante 3 PTAS,
de Litueche"

* Se ha iniciado los trabajos en
la PTAS de la Ruta de Que-
ntaro, se comenzara por
la construcción de una Rehúo
y la Llanura de Barro

Carlos Soto B.

Y.T.O

17 01 2023

Oficio: 'Muestreo de 3 PTAS
de Litueche'



Se están realizando los muestreos de fosa séptica y letrina de Bombas.

Juan Soto B.

T.T.O.


27 01 2023



Obra: "Mejoramiento 3 PTA
de Litueche"

A Se visite la PTA de Avelutano
y a dar lo siguiente:

- a) Se está demandando aguas calientes de termas de Litueche a una empresa que por el Biotrust instalas en forma provisional, por lo tanto se solicita en forma urgente resolver este asunto
- b) Se está instalando infraestructura de la fase primera y la construcción de los equipos.
- c) Con fecha 26 de Enero de 2023 se aplicará multa por Atrazo.


Y. T. O.

03 02 2023




Obra: "Mejoramiento 3 PTAS, Litiche"

-Pista Oculatana

* Se este trabajo en la instalación de Moldes en los muros de la pista de Equipos y la zona pulmon/canones de Borkes

* Se le incluye el profesional de la obra por la Empresa que se encarga de con una Malla por un trabajo de obra sin profesional a campo, Art. Vº 8, numeral 8.4.3 de los B.A.E a la licitación.



J.T.O.

07 02 2023



de: "Mejoramiento 3 PTAS,

de Litueche"

- Poste Quilentaro

* Se observa el horionado de
la fane puros, dado que los muros
no cumplen con su espesor y
la calidad de la terminación proxima
muros.

* Se solicita la demolición del elemento

P.T.O.

09 07 2023



Dña ~~Concepción~~ Mejramier
PTAS, Lomero de Litueche

4 Con esta fecha se surte la
Notificación de oposición de Multa a
la Empresa WETLAND S.A., en
cumplido a lo indicado en fs
31 del presente libro.

4 Se anula documento.

Y.T.O.

17 02 2023



Orden: "Mejoramiento 3 PTAS
al biberón"

* Se está trabajando en la zona
de Limpieza de la Pote en Guadalupe

* Se ha terminado completamente la
zona y se está esperando a
que se termine con el pago
del paguado y se retiren los
puntos

Y.T.O.

21 02 2023



Objeto: Mejoramiento 3 PTAS, en Litueche

Se comienza con la demolición
de los muros de la fase futura y
semana de Bomberos

Se inicia con el retiro del material
de la zona de los Equipos de
la Pata en Quilientano

J.T.O
